


GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



# INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2019



# Inversión por Programa (Millones de Bolivianos)

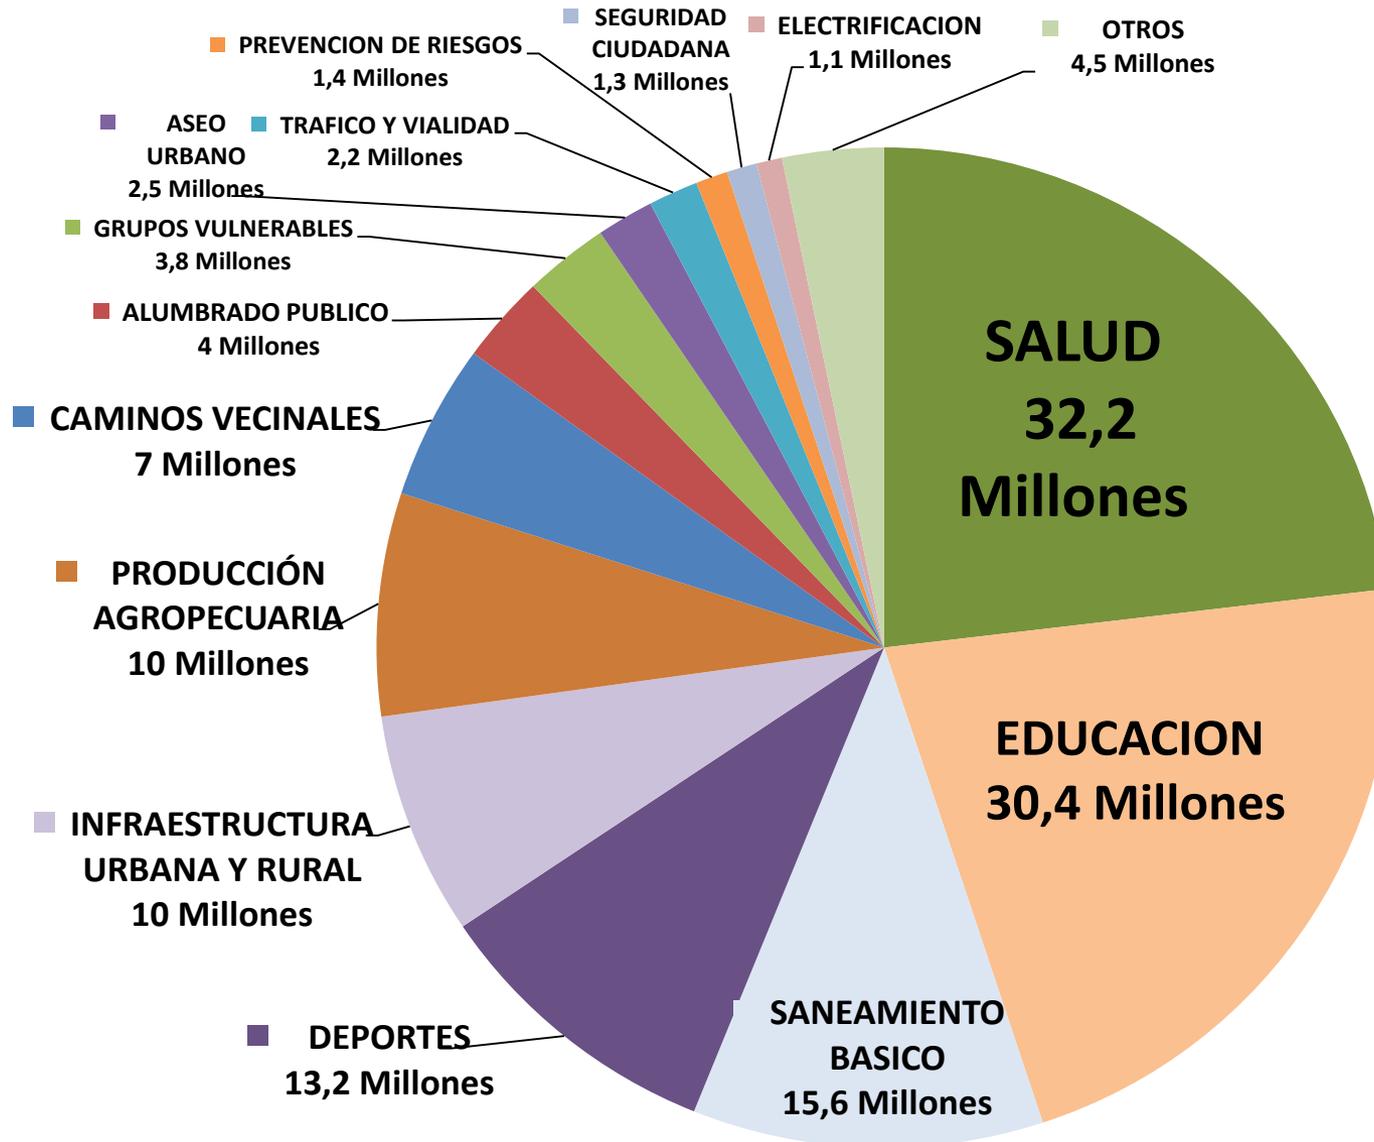

GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



**SALUD**



# SALUD

<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>
<b>32.236.004</b>	<b>21.732.366</b>	<b>64,4</b>

<b>APERTURAS PROGRAMATICAS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>
<b>INFRAESTRUCTURA</b>			
<b>AMPL. CENTRO DE SALUD TILATA. DISTRITO 7</b>	<b>3.000.420</b>	<b>2.919.926</b>	<b>97,3</b>
<b>CONST. AMPLIACION HOSPITAL DE 2DO NIVEL. SECCIONAL</b>	<b>500.000</b>	<b>275.180</b>	<b>55</b>
<b>CONST. CENTRO DE SALUD FLORIDA D-6 URBANIZACION FLORIDA DISTRITO 6</b>	<b>1.301.449</b>	<b>451.169</b>	<b>34,7</b>
<b>CONST. CENTRO DE SALUD JALSURI (NUEVA INFRAESTRUCTURA) DISTRITO D-3</b>	<b>19.786</b>	<b>19.783</b>	<b>100</b>
<b>CONST. UNIDAD DE HEMODIALISIS HOSPITAL DE 2DO NIVEL</b>	<b>88.050</b>	<b>82.044</b>	<b>93,2</b>
<b>CONST. PATIO DE INGRESO CENTRO DE SALUD JALSURI DISTRITO 3</b>	<b>100.000</b>	<b>99.782</b>	<b>99,8</b>
<b>CONST. SALA DE REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD COLLAGUA DISTRITO 3</b>	<b>100.000</b>	<b>99.965</b>	<b>100</b>
<b>MEJ. AREA DE GINECOLOGIA HOSPITAL DE 2DO NIVEL</b>	<b>182.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MEJ. AREA DE SERVICIO CENTRO DE SALUD VIACHA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# SALUD

APERTURAS PROGRAMATICAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>ACTIVIDADES - CONSULTORIA, PERSONAL, EQUIPAMIENTO, MEDICAMENTOS E INSUMOS</b>			
APOYO AL SERVICIO DE SALUD	642.631	583.101	90,7
APOYO A ZONOSIS	150.000	149.159	99,4
CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN Y CASTRACIÓN	35.000	34.623	98,9
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	100.000	67.368	67,4
APOYO A LA RED DE SERVICIOS EN SALUD VIACHA	2.526.868	2.333.926	92,4
APOYO AL SERVICIO DEL HOSPITAL 2DO NIVEL	2.198.246	1.892.889	86,1
EQUIPAMIENTO EN SALUD	489.344	482.449	98,6
CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN Y CASTRACIÓN	50.000	49.883	99,8
MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	87.048	86.378	99,2
PLAN MUNICIPAL DE SALUD	50.000	50.000	100
CENTRO DE SALUD VIACHA D-2	645.000	635.599	98,5
CENTRO DE SALUD LA FLORIDA D-6	476.000	412.312	86,6
CENTRO DE SALUD VILLA REMEDIOS D-3	383.500	323.932	84,5
CENTRO DE SALUD CONIRI D-3	178.560	110.942	62,1
CENTRO DE SALUD HILATA CENTRO D-3	119.500	99.802	83,5
CENTRO DE SALUD JALSURI D-3	272.000	200.321	73,6
CENTRO DE SALUD CHACOMA D-3	186.440	139.087	74,6
CENTRO DE SALUD COLLAGUA D-3	75.000	54.361	72,5
HOSPITAL MUNICIPAL DE VIACHA D-1	7.403.000	7.398.085	99,9
CENTRO DE SALUD TILATA D-7	675.000	655.795	97,2

# SALUD

APERTURAS PROGRAMATICAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>PRESUPUESTO PARA PAGO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS EN SALUD</b>			
<b>* PRESTACIONES DE SERVICIO DE SALUD INTEGRAL</b>	<b>10.100.664</b>	<b>2.024.508</b>	<b>20</b>

**\*CON LA LEY MODIFICATORIA DE LA LEY 475 DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, ESTE PRESUPUESTO ESTABA DESTINADO AL PAGO POR PRESTACIONES DE SALUD**

**\*CON LA LEY N° 1152 MODIFICATORIA A LA LEY N° 475, DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013, DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, MODIFICADA POR LEY N° 1069, DE 28 DE MAYO DE 2018, YA NO SE EFECTUA EL PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EN SALUD POR LO QUE ESTA APERTURA SOLO PRESENTA UNA EJECUCION PRESUPUESTARIA HASTA EL MES DE MARZO DE 2019, YA QUE CON LA NUEVA LEY LOS RECURSOS DE COPARTICIPACION SALUD, PASAN DIRECTAMENTE EN EFECTIVO DE ACUERDO A PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD.**

# GESTIÓN DE SALUD

**AMPLIACIÓN CENTRO DE  
SALUD TILATA. DISTRITO 7**

**MONTO  
CONTRATADO**

**3.000.420**

**EJECUTADO**

**2.919.926.13**

**%**

**97,32**

**OBRA FINA E INSTALACIONES**



# GESTIÓN DE SALUD

**CONSTRUCCIÓN CENTRO DE  
SALUD FLORIDA (NUEVA  
INFRAESTRUCTURA) URB.  
FLORIDA, DISTRITO 6**

**MONTO  
CONTRATADO**

**1.301.449**


**EJECUTADO**

**451.169,00**

**%**

**34,7**

**GRUESA, OBRA FINA E INSTALACIONES**

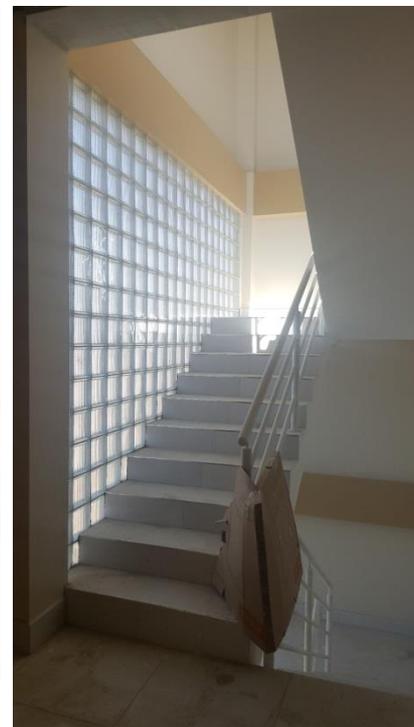

# GESTIÓN DE SALUD

**CONSTRUCCIÓN  
AMPLIACIÓN HOSPITAL DE  
2DO NIVEL, SECCIONAL**

**PRESUPUESTO**

**500.000**

**EJECUTADO**

**275.179.54**

**%**

**55,04**

**ÁREA DE SERVICIOS – LAVANDERÍA**



# GESTIÓN DE SALUD

**CONSTRUCCIÓN PATIO DE  
INGRESO CENTRO DE SALUD  
JALSURI, DISTRITO 3**

**PRESUPUESTO**

**100.000,00**

**EJECUTADO**

**99.781,82**

**%**

**99,78**

**ENLOSETADO DEL ÁREA DE INGRESO HACIA EL CENTRO DE SALUD**



# GESTIÓN DE SALUD

**CONSTRUCCIÓN SALA DE  
REHABILITACIÓN CENTRO DE  
SALUD COLLAGUA, DISTRITO 3**

**MONTO  
CONTRATADO**

**99.965,38**

**EJECUTADO**

**99.965,38**


**%**

**100**

**OBRA GRUESA**




# CUADRO COMPARATIVO POR MES PRESTACIONES Y ATENCIONES EN SALUD GESTION 2018 – 2019 (Expresado en miles)

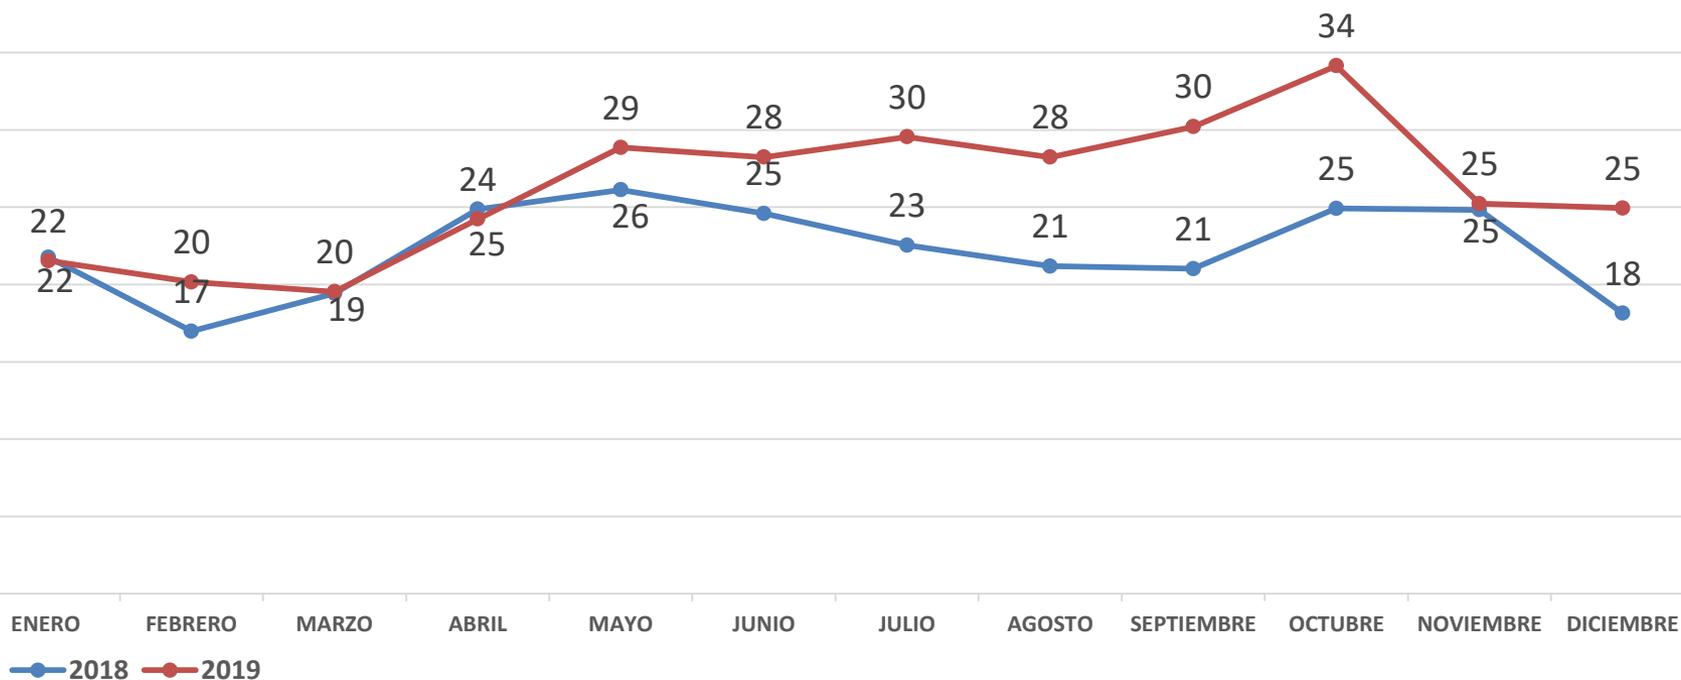

GESTION	TOTAL PRESTACIONES Y ATENCIONES (EXPRESADO EN MILES)
2018	266
2019	315

# CUADRO COMPARATIVOS DE INGRESOS POR PRESTACIONES Y ATENCIONES DE SALUD GESTION 2018 – 2019

(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVIANOS)



GESTION	TOTAL INGRESO EXPRESADO EN Bs.
<b>2018</b>	<b>6.920.000</b>
<b>2019</b>	<b>11.249.000</b>

## PERSONAL DE LA RED DE SALUD VIACHA

N°	CENTROS DE SALUD	PERSONAL			TOTAL
		GAMV	SEDES	MIN DE SALUD	
1	C.S. TILATA	19	3	6	28
2	C.S. CHACOMA	4	1	1	6
3	C.S. FLORIDA	8	5	1	14
4	C.S. JALSURI	5	1	1	7
5	C.S. VIACHA	7	10	0	17
6	C.S. CONIRI	4	1	1	6
7	C.S. VILLA REMEDIOS	5	1	1	7
8	C.S. COLLAGUA	1	1	1	3
9	C.S. HILATA	3	1	1	5
10	HOSPITAL MUNICIPAL	131	14	8	153
	RED DE AMBULANCIA	8			
	<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>254</b>
	<b>PORCENTAJE</b>	<b>77%</b>	<b>15%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>

## DISTRITOS Y SUS CENTROS DE SALUD

DISTRITOS	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Distrito 1 y 2	C.S. Viacha – Hospital 2do Nivel
Distrito - 3	C.S. Collagua C.S. Hilata Centro C.S. Coniri C.S. Chacoma C.S. Jalsuri C.S. Villa Remedios
Distrito - 6	C.S. Florida
Distrito - 7	C.S. Tilata

# COMPRA DE EQUIPAMIENTO, MEDICAMENTOS E INSUMOS GESTION 2019

## CENTRO DE SALUD DISTRITO 1 Y 2

DETALLE	Total en Bs.
Equipamiento	209,026.00
Medicamentos e Insumos	3,588,230.19
Otros	1,328,089.95
<b>TOTAL</b>	<b>5,125,346.14</b>

## CENTRO DE SALUD DISTRITO 3

DETALLE	Total en Bs.
Equipamiento	46,180.00
Medicamentos e Insumos	538,061.41
Otros	132,998.46
<b>TOTAL</b>	<b>717,239.87</b>

## CENTRO DE SALUD DISTRITO 6

DETALLE	Total en Bs.
Equipamiento	19,831.75
Medicamentos e Insumos	247,237.30
Otros	35,233.20
<b>TOTAL</b>	<b>302,302.25</b>

## CENTRO DE SALUD DISTRITO 7

DETALLE	Total en Bs.
Equipamiento	74,157.00
Medicamentos e Insumos	409,520.44
Otros	71,828.08
<b>TOTAL</b>	<b>555,505.52</b>

# ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTACION A LOS 9 CENTROS DE SALUD

CONSTA DE:

1. MONITOR
2. CPU
3. TECLADO
4. MOUSE
5. ANTENA DE WI-FI
6. IMPRESORA MULTIFUNCION

## C. SALUD DISTRITO 2

1 EQUIPO DE  
COMPUTACION COMPLETA  
CON IMPRESORA BS.  
8,281.00

## C. SALUD DISTRITO 3

6 EQUIPOS DE  
COMPUTACION COMPLETA  
CON IMPRESORA BS.  
49,686.00

## C. SALUD DISTRITO 6

1 EQUIPO DE  
COMPUTACION COMPLETA  
CON IMPRESORA BS.  
8,281.00

## C. SALUD DISTRITO 7

1 EQUIPO DE  
COMPUTACION COMPLETA  
CON IMPRESORA BS.  
8,281.00

TOTAL INVERSION DE BS.  
74,529.00



## GESTION DE SALUD

### DISTRIBUCION DE LA DONACIÓN GLOBAL LINK - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (Expresado en Bolivianos)

Nº	CENTROS BENEFICIADOS	TOTAL	%
1	CENTRO DE SALUD TILATA	136.931,35	23
2	CENTRO DE SALUD VIACHA	137.500,95	23
3	CENTROS DE SALUD VILLA REMEDIOS	86.801,93	14
4	CENTRO DE SALUD JALSURI	67.398,78	11
5	HOSPITAL 2 NIVEL VIACHA	172.861,56	29
<b>TOTAL</b>		<b>601.494,57</b>	<b>100</b>

# IMPLEMENTACION DE SALA DE PARTOS DE INTERCULTURALIDAD EN EL CENTRO DE SALUD JALSURI



## SALA DE PARTO HUMANIZADO

S/ A CUERDO ENTRE EL GAMV Y MEDICOS DEL MUNDO

EL GAMV ADECUACION DEL AMBIENTE

INVERSION DE: 4.750.-Bs.

1.-COLOCADO DE PISO FLOTANTE

2.- PINTADO DE LAS PAREDES

COMPROMISO DE MEDICOS DEL MUNDO

EQUIPAR:

CATRE,VITRINA, VELADOR, ESTANTE, ESTUFA, CAMAS. COLCHON



# GESTION DE SALUD

## APOYO A ZONOSIS

### Apoyo a Zoonosis Seccional

- ✓ CONTRATACION de 1 Técnico veterinario móvil, 1 coordinador de zoonosis, 1 auxiliar de captura de canes y 1 portero de zoonosis Adquisición insumos y medicamentos para el centro municipal zoonosis
- ✓ Adquisición de medicamentos
- ✓ Adquisición de insecticidas y raticidas
- ✓ Adquisición de una mochila fumigadora.
- ✓ Adquisición de indumentaria
- ✓ Adquisición de indumentaria de bioseguridad
- ✓ Pago de combustible y energía eléctrica
- ✓ Adquisición de equipos de red.



PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>150.000</b>	<b>149.159</b>	<b>99.4</b>
ACTIVIDADES CON APOYO A ZONOSIS	NRO. DE ATENCIONES	
CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE VECTORES EFECTUADOS 3 VECES AL AÑO	65 unidades educativas	
	4 unidades militares	
	1 mercado municipal	
	13 centros PDI	
	1 mercado municipal	
1 matadero municipal		
<b>Total</b>	<b>255 INTERVENCIONES AL AÑO</b>	
Atención veterinaria gratuitas	<b>166</b> animales domésticos	
Alberge de perros y gatos abandonados	<b>123</b>	
Perros entregados en adopción	<b>123</b>	
Captura de perros callejeros, agresivos y enfermos.	<b>556</b>	
Desparasitación de perros y gatos	<b>560</b>	
Eutanasias	<b>200</b>	

# GESTION DE SALUD

## Campañas Zoonosis

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA SECCIONAL	COBERTURA (CANES Y FELINOS)
<p>✓ Compra de insumos y materiales como (cintillos y jeringas en una cantidad de 42000, pago de combustible, pago de estipendios a vacunadores y personal que apoyaron en las campañas de vacunación</p>	<h3>40,711</h3>

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
35.000	34.623	98,9

ACTIVIDADES CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA	NRO. DE ATENCIONES
Perros y gatos vacunados	33.151 perros
	7.560 gatos
Control de casos positivos de rabia	0
Atención de casos de mordeduras por canes	46
Control y observación de casos de perros con posible rabia	12



# GESTION DE SALUD

## Campañas Zoonosis

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN Y CASTRACIÓN SECCIONAL	Nº DE ESTERILIZACIONES
Se realizo la compra de insumos, medicamentos equipos y matariles para las campañas de esterilización y castración para canes y felinos	<b>247 cirugías</b>

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>50.000</b>	<b>49.883</b>	<b>99,8</b>

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN	
<b>192 perros</b>	<b>55 gatos</b>



GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



# EDUCACIÓN



# DIRECCION DE GESTION EDUCATIVA CULTURA Y TURISMO

**SECCIONAL**

**PRESUPUESTO**

**EJECUTADO**

**%**

**30.396.020**

**19.805.541**

**65,2**

APERTURAS PROGRAMATICAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
APOYO A LA EDUCACION SECCIONAL	1.056.000	1.030.849	97,6
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR SECCIONAL	7.985.558	7.064.665	88,5
MANTENIMIENTO Y REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS	2.080.178	1.457.421	70,1
EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS SECCIONAL	2.488.815	2.171.069	87,2
MAESTRANZA ESCOLAR SECCIONAL	98.857	98.016	99,1
SERVICIO DE INTERNET TELECENTROS SECCIONAL	157.500	157.037	99,7
PROGRAMA DE DESARROLLO INICIAL (PDI) SECCIONAL	800.000	793.506	99,2
EQUIPAMIENTO DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION VIACHA	40.000	32.518	81,3
PROGRAMA POST ALFABETIZACIÓN SECCIONAL	50.000	45.595	91,2
MATERIAL DE ESCRITORIO U.E.	47.000	38.587	82,1
OLIMPIADAS CIENTIFICAS ESTUDIANTILES	15.000	8.840	58,9
DOTACIÓN DE COMPUTADORAS UNIDADES EDUCATIVAS	86.130	86.130	100,0
MANTENIMIENTO TELECENTROS SECCIONAL	50.000	50.000	100,0
LIMPIEZA DE POSOS SEPTICOS U.E., SECCIONAL	45.000	34.236	76,1
APOYO A EVENTOS EDUCATIVOS - EXPERIENCIAS INNOVADORAS	40.000	17.450	43,6
FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA	16.970	14.104	83,1
APOYO A LA EDUCACION Y COMUNICACIÓN DISTRITO 7	112.880	103.879	92,0
CONSTRUCCIÓN EN UNIDADES EDUCATIVAS (69 PROYECTOS)	15.226.132	6.601.641	43,4

# GESTIÓN DE EDUCACIÓN

**MANTENIMIENTO Y  
REFACCIONES DE UNIDADES  
EDUCATIVAS, SECCIONAL**

**PRESUPUESTO**

**2.080.178**

**EJECUTADO**

**1.457.421**

**%**

**71**



**U.E. JOSE BALLIVIAN A, B, C**



**PARQUE U.E. NORAH G. DE ZEBALLOS**



**LABORATORIO U.E. 20 DE OCTUBRE**




**U.E. JOSE BALLIVIAN "C"**

# GESTIÓN DE EDUCACIÓN

**CONSTRUCCIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA CEA 21  
DE SEPTIEMBRE, DISTRITO 1**

<b>MONTO CONTRATADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>
<b>998.297,29</b>	<b>998.297,29</b>	<b>100</b>

**OBRA FINA**

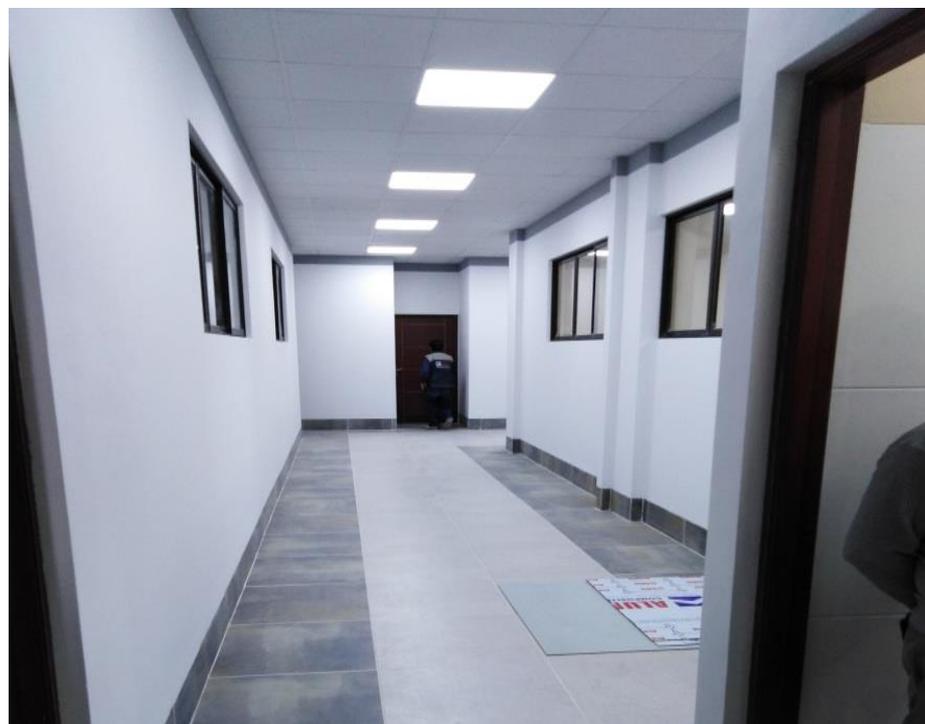

# GESTIÓN DE EDUCACIÓN

**CONSTRUCCIÓN 2DO. BLOQUE DE  
AULAS U.E. 18 DE NOVIEMBRE Y  
20 DE OCTUBRE, DISTRITO 2**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
505.097,00	436.396,52	86

**OBRA FINA PLANTA BAJA**



# GESTIÓN DE EDUCACIÓN

**CONSTRUCCIÓN ESCUELA  
TÉCNICA SUPERIOR, DISTRITO 2**

**PRESUPUESTO**

**1.660.893**

**EJECUTADO**

**999.739**

**%**

**60,2**

**OBRA GRUESA PLANTA BAJA Y 1 PISO**



# EDUCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE U.E.

**CONSTRUCCIÓN AULAS U.E.  
HUGO BANZER SUAREZ,  
DISTRITO 6, (CONCLUSIÓN DE  
OBRA FINA)**

**PRESUPUESTO**

**277.000**

**EJECUTADO**

**272.171,57**

**%**

**98,26**

**PROYECTO DE CONTINUIDAD Y LA CONCLUSION DE OBRA FINA**



**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LADRILLO U.E.  
HUGO BANZER SUAREZ**



**ENTREGA DE NUEVAS AULAS PISO DE  
ENTABLONADO U.E. HUGO BANZER SUAREZ**

# EDUCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE U.E.

**CONSTRUCCION TALLER  
TECNOLOGICO U.E. LA  
FLORIDA, UNID.EDU. "LA  
FLORIDA"**

**PRESUPUESTO**

**192.140**

**EJECUTADO**

**192.130,40**

**%**

**100**

**CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS AULAS TECNÓLOGICAS, ZAPATAS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSA**



**INSPECCIÓN, EXCAVACIÓN Y VACIADO DE  
CARPETA DE NIVELACIÓN U.E. LA FLORIDA**



**VACIADO DE LOSA CON HORMIGÓN  
PREMEZCLADO U.E. LA FLORIDA**

# EDUCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE U.E.

**CONSTRUCCION PROSCENIO  
U.E. VILIROCO, DISTRITO 6**

**PRESUPUESTO**

**50.000**

**EJECUTADO**

**49.971,84**

**%**

**99,94**

**COMPLEMENTACIÓN ACCESOS A PROSCENIO**



**PROSCENIO U.E. VILIROCO**



**VACIADO DE ACCESOS A LABORATORIOS DE  
COMPUTACIÓN U.E. VILIROCO**

# EDUCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE U.E.

**MANT. Y REFACCIÓN DE U. E. SECCIONAL (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y OTROS, UNIDAD EDUCATIVA BATALLA ALTO DE LA ALIANZA).**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>10.833</b>	<b>10.500,20</b>	<b>96,93</b>

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**



**REVOQUE DE MORTERO, YESO INTERIOR  
U.E. BATALLA ALTO DE LA ALIANZA**



**PINTADO DE EXTERIOR U.E. BATALLA  
ALTO DE LA ALIANZA**

# EDUCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE U.E.

**MANT. Y REFACCIÓN DE U. E,  
SECCIONAL (ADQUISICIÓN DE  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y  
FERRETERÍA PARA LA UNIDAD  
EDUCATIVA VILIROCO  
A Y B).**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>50.000</b>	<b>49.764,00</b>	<b>99,53</b>

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE  
CONSTRUCCIÓN**



**ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS U.E.  
VILIROCO DISTRITO 6**



**CONSTRUCCIÓN DE NUEVO POZO  
SÉPTICO U.E. VILIROCO**

# EDUCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE U.E.

**LIMPIEZA DE POZOS  
SEPTICOS UNIDADES  
EDUCATIVAS, SECCIONAL**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
45.000	34.236	76,1



**LIMPIEZA UNIDADES EDUCATIVAS D-3**



**LIMPIEZA UNIDADES EDUCATIVAS D-7**

# PROGRAMA (EDUCACION)

**CONSTRUCCIÓN AULAS  
U.E. REPUBLICA DEL JAPON**

**PRESUPUESTO**

**74,431**

**EJECUTADO**

**74,415**

**%**

**100**

**CONSTRUCCION DE 8 AULAS 2DA. FASE**



# PROGRAMA (EDUCACION)

**CONSTRUCCION AULAS  
U.E. FRED NUÑEZ GONZALES D-7**

**PRESUPUESTO**

**62,181**

**EJECUTADO**

**61,606**

**%**

**99,10**

**CONSTRUCCION DE 8 AULAS 1RA FASE**



# PROGRAMA (EDUCACION)

**CONSTR. TINGLADO  
U.E. 6 DE JUNIO**

**PRESUPUESTO  
305,524**

**EJECUTADO  
303,961**

**%  
99,50**

**CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL TINGLADO 2DA FASE**



# PROGRAMA (EDUCACION)

**CONSTR. BLOQUE  
ADMINISTRATIVO  
U.E. URKUPIÑA II**

**PRESUPUESTO  
141,075**

**EJECUTADO  
90,004**

**%  
63,80**

**CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2DA FASE**



# PROGRAMA (EDUCACION)

**CONSTR. AULAS  
PEDAGOGICAS  
U.E. MARISCAL SANTA CRUZ**

**PRESUPUESTO**

**100,000**

**EJECUTADO**

**99,815**

**%**

**99,80**

**CONSTRUCCION DE 8 AULAS 1RA FASE**



# PROGRAMA (EDUCACION)

**CONSTRUCCIÓN AULAS  
U.E. MURUHAMAYA**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
34.230.00	34.056.04	99,5

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CUBIERTA CON  
ESTRUCTURA METÁLICA) – OBRA GRUESA**



# PROGRAMA (EDUCACION)

**CONSTRUCCION TINGLADO  
POLIFUNCIONAL  
U.E. JOSE BALLIVIAN DE  
HICHURAYA**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
10.763,00	10,763,00	100

**ADQUISICIÓN DE LOSAS HUECAS PARA GRADERIAS – EJECUCION MANO DE OBRA LOCAL**



# PROGRAMA (EDUCACIÓN)

**CONSTRUCCION TINGLADO  
POLIFUNCIONAL U.E. PAN DE  
AZUCAR D-3**

**PRESUPUESTO**

**151.000**

**EJECUTADO**

**150,551**

**%**

**99,7**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON CALAMINA TRAPEZOIDAL – EJECUCIÓN DELEGADA**



# GESTIÓN DE EDUCACIÓN

**CONSTRUCCIÓN TÉCNICO  
HUMANÍSTICO UNIDAD  
EDUCATIVA SAN JOSE D-2**

**MONTO  
CONTRATADO**

**5.788.036**

**EJECUTADO**

**1.592.824**

**%**

**27,5**

## PROYECTO UPRE



# PROYECCION DE AULAS

UNIDAD EDUCATIVA	AULAS POR CONCLUIR	ESTUDIANTES BENEFICIADOS
REPUBLICA DE JAPON	8	240
FRED NUÑEZ GONZALES	8	240
MCAL. SANTA CRUZ	8	240
SAN JOSE	15	450
HUGO ORDOÑEZ	5	150
ROSA AGRAMONT	4	120
MURUAMAYA	2	60
SAN NICOLAS	6	180
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>1680</b>



# APOYO A LA EDUCACIÓN

## PAGO DE SERVICIOS BASICOS UNIDADES EDUCATIVAS

PRESUPUESTO

EJECUTADO

%

1.056.000

1.030.849

98

### ENERGIA ELECTRICA

634.216 Bs.



### AGUA

218.832 Bs.



### ALQUILER – COMBUSTIBLE Y OTROS

176.990 Bs.



### TELEFONIA

811,00 Bs.



BENEFICIARIOS:

**109**

ESTABLECIMIENTOS  
EDUCATIVOS

**101** U.E  
EDUCACION  
REGULAR

**7** C.E.A.S.

**1** CENTRO  
EDUCACIÓN  
ESPECIAL.



# ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR

**BENEFICIARIOS:** 20.974  
**102 UNID. EDU.**  
**TIEMPO: 190 DÍAS**

**RACIONES/  
POR DÍA**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
7.985.558	7.064.665	88,5

## RACIONES SOLIDAS:

Banano. naranja. mandarina y  
Manzana.

Empanada integral con relleno,  
queque de diferentes sabores, pan de  
cereales y leguminosas, Galletas  
saladas y dulces con harinas mixtas,  
galletas con chips de chocolate.

## RACIONES LIQUIDAS:

Jugo con pulpa de frutas , yogurt  
probiótico saborizado, yogurt frutado  
(vaso), alimento bebible de soya  
saborizado, leche de vaca cholatada,  
alimento bebible a base de extracto  
de soya y leche de vaca, gelatina con  
frutas, horchata de coco.



**DISTRIBUCION DE RACIONES NIÑOS/AS**

# EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS

<b>BENEFICIARIOS:</b> <b>42</b> <b>ESTABLECIMIENTOS</b> <b>EDUCATIVOS</b>	<b>39 EDUCACION</b> <b>REGULAR</b> <b>3 C.E.A.</b>
--	--

<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>
<b>2.488.815</b>	<b>2.171.069</b>	<b>87,2</b>



**UNIDAD EDUCATIVA NESTOR PAZ ZAMORA**



**UNIDADES EDUCATIVAS D-3**

- EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
- MOBILIARIO ESCOLAR
- EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN
- INSTRUMENTOS MUSICALES
- CÁMARAS DE SEGURIDAD
- IMPLEMENTOS EDUCATIVOS
- MATERIAL PARA LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA
- MATERIAL DEPORTIVO Y OTROS.

# PROGRAMA DE DESARROLLO INICIAL P.D.I.

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
800.000	793.506	99,2

**BENEFICIARIOS:**

- 365 NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.

**13 CENTROS INFANTILES POR DISTRITOS :**

- ✓ D-1 (4 CENTROS)
- ✓ D-2 (3 CENTROS)
- ✓ D-7 (3 CENTROS)

- PAGO DE 52 BECAS ALIMENTICIAS
  - ✓ 39 EDUCADORAS
  - ✓ 13 RESPONSABLES DE ALIMENTOS.
- COMPRA DE ALIMENTOS SECOS Y DE CONSERVA, MATERIALES DIDÁCTICOS, LIMPIEZA Y OTROS.



# PROGRAMA DE POST-ALFABETIZACION

**97,8% DE LA POBLACION  
MUNICIPIO DE VIACHA TIENE  
FORMACION EN EL NIVEL  
PRIMARIO**

- **11 GRUPOS APERTURADOS DE POST ALFABETIZACIÓN D-3.**
- **11 DOCENTES FACILITADORES D-3.**

## **BENEFICIARIOS:**

- **113 PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS D-3.**
- **65 POR GRADUAR DEL NIVEL PRIMARIO D-3.**

- **GAMV: LANA, CUADERNOS Y LÁPIZ PARA LOS PARTICIPANTES**
- **MIN. EDU. 600 LIBROS PARA 3 BIBLIOTECAS COMUNITARIAS D-3**

**PRESUPUESTO**

**50.000**

**EJECUTADO**

**45.595**

**%**

**91,2**



# GESTIONES REALIZADAS PARA EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS

**PRESUPUESTO  
MINISTERIO DE EDUCACION  
907.323,52 Bs.**

**BENEFICIARIOS:  
17 UNID. EDUCATIVAS NIVEL  
SECUNDARIO**

**GAMV:**  
GARANTIZÓ LA  
INFRAESTRUCTURA  
DE LOS  
LABORATORIOS

▪ **MINISTERIO  
EDUCACION**  
EQUIPAMIENTO,  
INSUMOS Y  
MATERIALES  
PARA  
LABORATORIOS  
DE FÍSICA,  
QUÍMICA,  
BIOLOGÍA Y  
GEOGRAFÍA.



# EL GAMV APOYO A ESTUDIANTES DE LA U.E. JOSE BALLIVIAN QUE REPRESENTO A BOLIVIA EN LA NASA

**PRESUPUESTO GAMV**  
**11.410 Bs.**

Viajaron a EE. UU. donde se llevó a cabo el concurso Desafío del Explorador Humano (Human Exploration Rover Challenge).

DESCRIPCION	PRESUPUESTO
CAMARA PROFESIONAL DIGITAL	8.560 Bs.
INDUMENTARIA PARA LA REPRESENTACIÓN	2.850 Bs.



GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL





# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

Localizacion	presupuesto	ejecutado	%
SECCIONAL	1,895,631.00	1,881,744.40	99.27
DISTRITO 1	2,893,989.00	2,425,882.48	83.82
DISTRITO 2	2,970,604.00	2,073,343.96	69.80
DISTRITO 3	188,358.00	185,447.00	98.45
DISTRITO 6	1,529,106.96	1,179,972.61	77.17
DISTRITO 7	565,614.00	362,171.39	64.03
	<b>10,043,302.96</b>	<b>8,108,561.84</b>	<b>80.74</b>

# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

## MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, SECCIONAL

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
39,985,86	39,985,86	100

Trabajos realizados: Mejora de los ambientes de atención y áreas de exteriores en la Unidad de Zoonosis.



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**MANTENIMIENTO CUBIERTA  
PALACIO CONSISTORIAL,  
SECCIONAL**

**PRESUPUESTO**

**EJECUTADO**


**%**

**30.000,00**

**29.903,74**

**99,68**

**CUBIERTA PALACIO CONSISTORIAL: Cambio de la cubierta de policarbonato.**

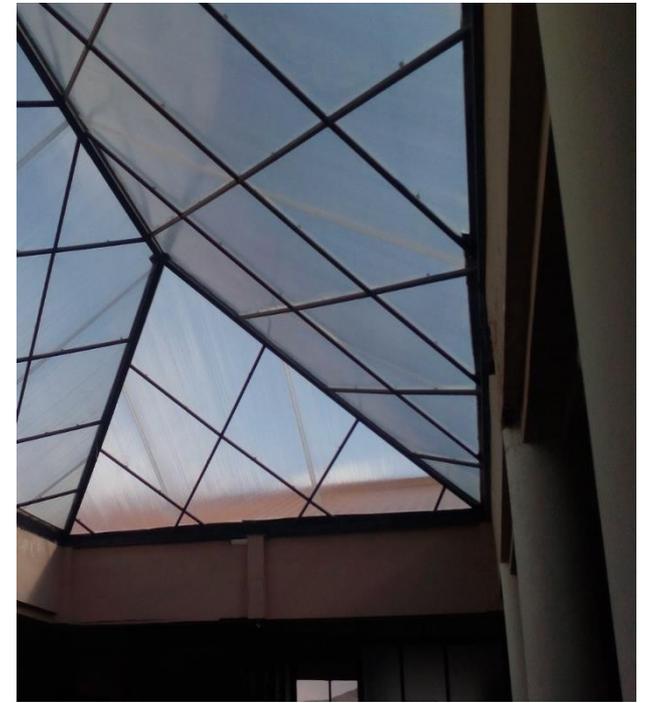

# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

## MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS, DISTRITO 1

PRESUPUESTO

EJECUTADO

%

70.000,00

39.930,49

61

Cancha Césped Sintético Z/Barrio Lindo.



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO  
AVENIDA VILLA REMEDIOS  
PROGRESIVA 0+000 HASTA 0+220**

**PRESUPUESTO**

**900.000**

**EJECUTADO**

**711.690,50**

**%**

**79,07**

CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)	Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)	EJECUCION FISICA (%)
<b>3.364,3</b>	<b>4.800</b>	<b>85</b>



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

## CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO TRAMO

AV. INGAVI-AV. HACIA EL MAR D-1  
PROGRESIVA 0+000 HASTA 0+250

PRESUPUESTO

**700.000**

EJECUTADO

**515.742**

%

**73,7**

CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)	Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)	EJECUCION FISICA (%)
<b>1.891</b>	<b>3.500</b>	<b>95</b>



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCION ENLOSETADO  
Y CAMBIO DE SUELO C/LOS  
PINOS ENTRE C/IRPA CHICO Y  
PACAJES D-1**

**PRESUPUESTO**

**200.000**


**EJECUTADO**

**191.289,77**

**%**

**95,64**

<b>CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)</b>	<b>Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>	<b>EJECUCION FISICA (%)</b>
<b>901</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>

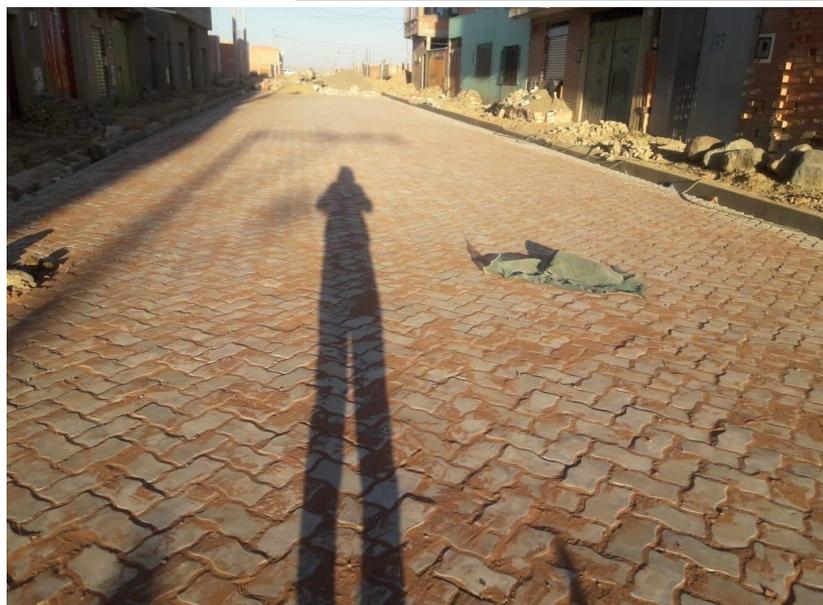

# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCION CORDONES DE  
ACERA C/SANTA CRUZ ENTRE 20 DE  
OCTUBRE Y HERNANDO SILES  
Z/PORVENIR D-1**

**PRESUPUESTO**

**36.000**

**EJECUTADO**

**34.904,53**

**%**

**96,95**

<b>CANTIDAD CONSTRUIDA (ML)</b>	<b>Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>	<b>EJECUCION FISICA (%)</b>
<b>208</b>	<b>2.500</b>	<b>100</b>



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO Y  
CAMBIO DE SUELO C/CRISTOBAL  
COLON Y GENARO SANJINEZ Z/JOSE  
BALLIVIAN D-1**

**PRESUPUESTO**

**100.000**


**EJECUTADO**

**96.241,02**

**%**

**96,24**

<b>CANTIDAD CONSTRUIDA (ML)</b>	<b>Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>	<b>EJECUCION FISICA (%)</b>
<b>382.57</b>	<b>1500</b>	<b>100</b>

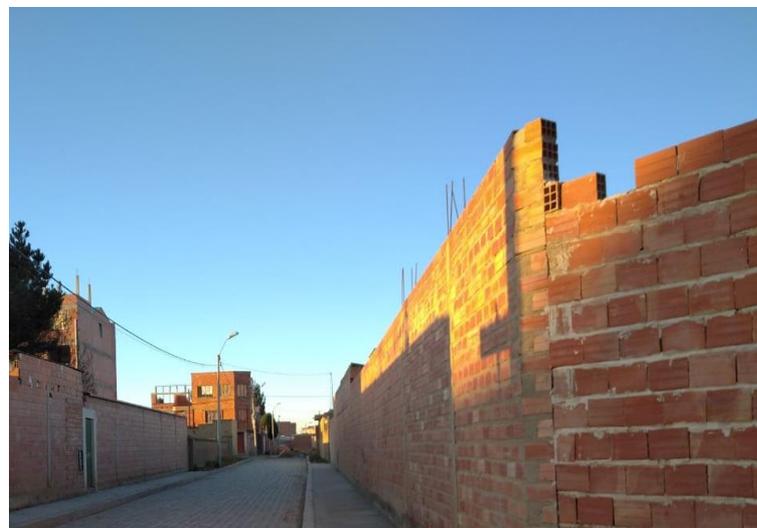

# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**REAFACCION Y MANTENIMIENTO DE  
CAMINOS, SECCIONAL- CALLE  
LETANIAS**

**PRESUPUESTO**

**300.000**

**EJECUTADO**

**269.798,72**

**%**

**89,93**

<b>CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)</b>	<b>Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>	<b>EJECUCION FISICA (%)</b>
<b>937.00</b>	<b>2500</b>	<b>100</b>



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN CORDONES DE ACERA - C/5 ENTRE AV. "A" Y AV. HUMACHUA Z/EDUARDO AVAROA D-1**

**PRESUPUESTO**

**11.000**

**EJECUTADO**

**10.788,50**

**%**

**98,07**

<b>CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)</b>	<b>Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>	<b>EJECUCION FISICA (%)</b>
<b>125.00</b>	<b>1700</b>	<b>100</b>



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCION CORDONES DE ACERA C/IRPA CHICO ENTRE AV. SIMON BOLIVAR Y AV. VILLA REMEDIOS URB. SANTIAGO D-1**

**PRESUPUESTO**

**50.000**

**EJECUTADO**

**49.408,75**

**%**

**98,81**

<b>CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)</b>	<b>Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>	<b>EJECUCION FISICA (%)</b>
<b>370.00</b>	<b>1500</b>	<b>100</b>



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCION CORDONES DE  
ACERA AV. ARICA, C/S/N, C/MAX  
FERNANDEZ Y C/SOPOCACHI Z/SAN  
FELIPE D-1**

**PRESUPUESTO**

**30.000**

**EJECUTADO**

**29.570,00**

**%**

**98,56**

<b>CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)</b>	<b>Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>	<b>EJECUCION FISICA (%)</b>
<b>275.00</b>	<b>1500</b>	<b>100</b>



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN CORDONES DE ACERA - C/2 ENTRE AV. CENTRAL Y C/PANDO Y AV. CENTRAL ENTRE C/1 Y 2 Z/LAS RETAMAS D-1**

**PRESUPUESTO**

**18.950**

**EJECUTADO**

**18.826,56**

**%**

**99,35**

<b>CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)</b>	<b>Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>	<b>EJECUCION FISICA (%)</b>
<b>125.00</b>	<b>1200</b>	<b>100</b>



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCION CENTRO  
CULTURAL, Z/AV. BARRIENTOS,  
DISTRITO 2**

**PRESUPUESTO**

**200.000,00**

**EJECUTADO**

**199.497.76**

**%**

**99,75**

**OBRA GRUESA 2º PISO**



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**MEJORAMIENTO PLAZA  
MARISCAL JOSÉ BALLIVIAN,  
DISTRITO 2**

**PRESUPUESTO**

**390.000,00**


**EJECUTADO**

**90.000,00**

**%**

**23,08**

**CONSULTORÍA POR PRODUCTO**

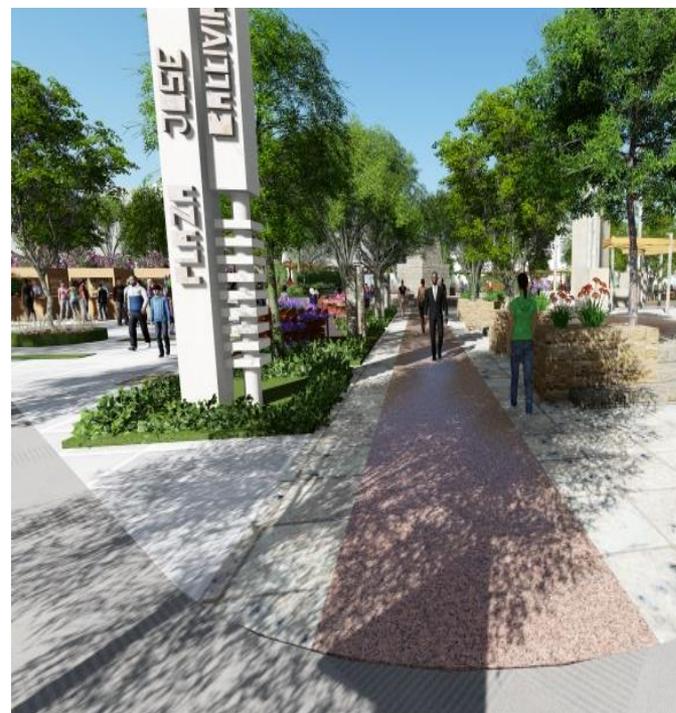

# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN CENTRO  
CULTURAL ZONA MONTES "B",  
DISTRITO 2**

**PRESUPUESTO**

**150.000**

**EJECUTADO**

**148.738**

**%**

**99,16**

**OBRA GRUESA**



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

## CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO AV. PISAGUA ENTRE PUENTE KALA CHACA Y C/PARAGUAY Z/SANTA BARBARA D-2

CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)	Nº BENEFICIARIOS (HABITANTES)	EJECUCION FISICA (%)
880	100	60

PRESUPUESTO

**400.000**

EJECUTADO

**317.351**

%

**79,3**



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO Y  
CAMBIO DE SUELO, C/4 ENTRE C/1 Y 2  
Z/SAN JUAN HISKA SARIJA**

**PRESUPUESTO**

**180.000,00**

**EJECUTADO**

**178.766,14**

**%**

**99,3**

**624 M2 DE ENLOSETADO, 200 ML DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS**

**PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS CALENDARIO**



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO, C/LAS PALMERAS ENTRE C/RETAMAS Y LOS PINOS Z/PLAYA VERDE

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
140.000,00	138.753,70	99,1

474 M2 DE ENLOSETADO, 182 ML DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS

PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS CALENDARIO



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO Y CAMBIO DE  
SUELO, C/BATALLÓN COLORADO ENTRE  
C/MURILLO Y BRASIL Z/POCITOS  
CHUQUIAGUILLO

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
130.000,00	128.433,11	98,8

454 M2 DE ENLOSETADO, 171 ML DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS

PLAZO DE EJECUCION: 38 DIAS CALENDARIO



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO, C/KANTUTA ENTRE C/PALMERAS Y LOS ALAMOS Z/PLAYA VERDE

PRESUPUESTO

130.000,00

EJECUTADO

129.994,23

%

99,9

370 M2 DE ENLOSETADO, 200 ML DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS

PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS CALENDARIO



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO, C/PINILLA ENTRE C/ITURRALDE Y TIQUINA Z/18 DE NOVIEMBRE

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
180.000,00	179.989,87	99,9

741 M2 DE ENLOSETADO, 186 ML DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS

PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS CALENDARIO



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO, C/"B" ENTRE C/4 Y 2 Z/16 DE JULIO**

<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>
<b>230.000,00</b>	<b>228.872,16</b>	<b>99,5</b>

**890 M2 DE ENLOSETADO, 192 ML DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS**

**PLAZO DE EJECUCION: 40 DIAS CALENDARIO**



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

CONSTRUCCIÓN CORDONES DE ACERA,  
C/PINILLA ENTRE AV. PISAGUA Y AV. PANDO  
Z/CENTRAL, D-2

PRESUPUESTO

86.600,00

EJECUTADO

84.984,15

%

98,8

493 ML DE CORDONES DE ACERA

PLAZO DE EJECUCION: 16 DIAS CALENDARIO



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**MEJORAMIENTO CUBIERTA  
CAMPOS DE INGAVI D-3**

**PRESUPUESTO**

**40.000,00**

**EJECUTADO**

**40,000,00**

**%**

**100**

**CAMBIO DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA**



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONST. CASA CULTURAL  
MARCA JACHA HILATA  
DISTRITO 3**

**PRESUPUESTO**

**110.000**

**EJECUTADO**

**109,478,55**

**%**

**99,53**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – OBRA GRUESA – MANO DE OBRA LOCAL**



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONST. ENLOSETADO COM.  
SEQUEJAHUIRA D-3**

**PRESUPUESTO**

**59.436**

**EJECUTADO**

**57.669**

**%**

**97,0**

CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)	N° BENEFICIARIOS (HABITANTES)	EJECUCION FISICA (%)
<b>496</b>	<b>70</b>	<b>100</b>



# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN CASA CULTURAL  
URB. JOSÉ BALLIVIAN "B", D-6  
(OBRA GRUESA Y OBRA FINA)**

**PRESUPUESTO**

**1.100.000**

**EJECUTADO**

**720.086,12**

**%**

**65,46**

**EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO FÍSICAMENTE EN SU PRIMERA FASE**



Vaciado de viga de encadenado Urb. José Ballivian DISTRITO 6



Entrega de la Primera Fase Vaciado Casa Cultural Urb. José Ballivian DISTRITO 6

# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN CASA  
CULTURAL URB. JOSÉ  
BALLIVIAN "B", D-6 FASE II**

**PRESUPUESTO**

**100.000**

**EJECUTADO**

**99.776,45**

**%**

**99,78**

**SE REALIZA ACTIVIDADES EN LA PLANTA SEGUNDO PISO PARA COMPLEMENTAR CON LAS OBRAS**



Construcción de pozo séptico Urb. José Ballivian "B" DISTRITO 6



Vaciado de contrapiso en todos los ambientes, revoque con estuco en todos los ambientes Urb.

José Ballivian "B" DISTRITO 6

# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN CASA CULTURAL, URB. LA FLORIDA D-6 (ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA).**

**PRESUPUESTO**

**33.308**

**EJECUTADO**

**33.300,10**

**%**

**99,98**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VACIADO DE LOSA**



Compra de poli estireno Casa Cultural Urb. La Florida DISTRITO 6



Compra de viguetas SOBROPRET Casa Cultural Urb. La Florida DISTRITO 6

# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN PLAZA DE  
ARMAS URB. JOSÉ BALLIVIAN  
"B", DISTRITO 6 (FASE II)**

**PRESUPUESTO**

**200.000**

**EJECUTADO**

**185.552,73**

**%**

**92,78**

**MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA CON BALDOSAS (ELEMENTOS PREFABRICADOS),  
PARA ACTOS CÍVICOS**



Conformación de plataforma con material  
seleccionado Urb. José Ballivian "B"  
DISTRITO 6



Acabado del colocado de baldosas prefabricadas  
Urb. José Ballivian "B" DISTRITO 6

# INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

**CONSTRUCCIÓN PLAZA DE  
ARMAS URB. JOSÉ BALLIVIAN  
"B", DISTRITO 6 (FASE III)**

**PRESUPUESTO**

**100.000**

**EJECUTADO**

**99.422,31**

**%**

**99,42**

**MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA CON EMPIEDRE Y VACIADO DE CARPETA**



Conformación y empedre de plataforma  
Urb. José Ballivian "B" DISTRITO 6



Vaciado de carpeta de hormigón E=5cm y  
relleno de juntas de dilatación Urb. José  
Ballivian "B" DISTRITO 6

GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



# GESTION DE CAMINOS VECINALES



# GESTION DE CAMINOS VECINALES

## CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE DE VIACHA, SECCIONAL

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>2.397.536</b>	<b>1.875.004</b>	<b>78,2</b>

CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)	Nº BENEFICIARIOS	EJECUCION FISICA (%)
<b>4950</b>	-COM. GRANJA CONVENTO -COM. MAMANI	<b>40</b>



# GESTION DE CAMINOS VECINALES

MANTENIMIENTO VIAL Y CAMINERA,  
DISTRITO 2 (ADQUISICIÓN DE RIPIO,  
MANTENIMIENTO DE VÍA, URB. CBN )

PRESUPUESTO

65.000,00

EJECUTADO

63.700,00

%

98,0

1300 M3 DE RIPIO

PLAZO DE EJECUCION: 13 DIAS CALENDARIO



# GESTION DE CAMINOS VECINALES

**CARRETERA VIACHA –  
JALSURI (TRAMO 1**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100</b>

TOTAL DEL PROYECTO (BS)	CONTRAPARTE DEL GAMV (BS)	CANTIDAD CONSTRUIDA (M2)	TRANSFERENCIA 2020
<b>26.605.870</b>	<b>4.789.056</b>	<b>80.300</b>	<b>1.073.434</b>



# GESTION DE CAMINOS VECINALES

## CARRETERA EL ALTO – VIACHA (TRAMO 2. PROG. 14+594 – PROG. 16+194)

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>1.240.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>92</b>

ENTIDAD	PRESUPUESTO
GADLP	20.000.000
GAM Viacha	5.000.000

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
COSNSTRUCCIÓN. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	GADLP

CANTIDAD CONSTRUIDA (ML)	BENEFICIARIOS	EJECUCION FISICA (%)
<b>1.500</b>	<b>-VIACHA</b>	<b>100</b>



# GESTION DE CAMINOS VECINALES

**“PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VIA EL ALTO – VIACHA EN SU TRAMO II: VIACHA – PROGRESIVA 5.1”**

TOTAL DEL PROYECTO (\$US)	CONTRAPARTE DEL GAMV	CANTIDAD A CONSTRUIR (KM)
<b>27.510.500,00</b>	<b>LIBERACIÓN DE VIA</b>	<b>9,5</b>



# GESTION DE CAMINOS VECINALES

**CONSTR. ENLOSETADO AV. SAN SALVADOR Y AV. 3 URB. TILTATA**  
(Adquisición de losetas, áridos otros)

**PRESUPUESTO**

**1,500,000**

**EJECUTADO**

**0,00**

**%**

**0**

Se enlosetaran al rededor de **950 ml** con trabajos de contraparte vecinal y maquinaria de la sub alcaldía beneficiando a 3 urb. San Salvador, Concepción y el Rosario



# GESTION DE CAMINOS VECINALES

**CONSTR. ENLOSETADO CALLE 12,  
CALLE 21 DE SEPT, CALLE 2 Y AV.  
ALEMANIA URB. TILATA**

**(Adquisición de losetas, áridos otros)**

**PRESUPUESTO**

**1,500,000**

**EJECUTADO**

**0,00**

**%**

**0**

Se enlosetaran al rededor de **1,200 ml** con trabajos de contraparte vecinal y maquinaria de la sub alcaldía beneficiando a 4 urb. Urkupiña II, tilata UVC, UV3 y Curawuara de carangas.



# GESTION DE CAMINOS VECINALES

**CONSTR. ENLOSETADO CALLE 8  
CALLE 20 URB. MAC SANTA CRUZ**  
(Adquisición de losetas, áridos otros)

**PRESUPUESTO**

**1,000,000**

**EJECUTADO**

**0,00**

**%**

**0**

Se enlosetaran al rededor de **850 ml**, con trabajos de contraparte vecinal y maquinaria de la sub alcaldía beneficiando a 3 urb. Marc. Santa cruz Centauro, 9-22 y 8-N



# GESTION DE CAMINOS VECINALES

**CONSTR. ENLOSETADO CALLE 4  
URB. MARC. SANTA CRUZ  
(Adquisición de losetas, áridos otros)**

**PRESUPUESTO**

**1,000,000**

**EJECUTADO**

**0,00**

**%**

**0**

Se enlosetaran al rededor de **800 ml** beneficiando a 3 urb. Marc. Santa Cruz 3M, 5N y 4- O con trabajos de contraparte vecinal y maquinaria de la sub alcaldía



# MEJORAMIENTO DE CAMINOS D-3

PRESUPUESTO

405.119

EJECUTADO

390.028

%

96,3

MARKA	TOTAL DE DIAS	TOTAL EN Km.
MARKA IRPA CHICO (10 Comunidades)	31	68 KM
MARKA ACHICA (6 Comunidades)	24	61,8 KM.
MARKA BATALLA DE INGAVI (13 Comunidades)	29	141 KM.
MARKA CONTORNO (11 Comunidades)	27	107,8 KM.
MARKA CONIRI (5 Comunidades)	15	77,5 KM.



# MEJORAMIENTO D CAMINOS D-3

MARKA	TOTAL DE DIAS	TOTAL EN Km.
MARKA IRPA GRANDE (8 Comunidades)	17	91 KM.
VILLA SANTIAGO DE CHACOMA (4 Comunidades)	11	40 KM.
MARKA VILLA ANCARA (4 Comunidades)	19	53 KM.
MARKA JACHA HILATA (4 Comunidades)	12	49 KM.
<b>TOTAL 9 MARKAS (65 Comunidades)</b>	<b>TOTAL 185 DIAS</b>	<b>TOTAL 689,1 KM.</b>



## PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES

COMUNIDAD	TRABAJO REALIZADO	Km.
Com. Chusñupa	Muro de contención	3 km
Com. Ancara	Dragado de río	5 km
Com. Charahuayto	Dragado de río	10 km
Com. Mamani	Dragado de río	3 km.
Com. Chonchocoro	Dragado de río	5 km.
Com. Villa Ancara	Dragado de río	3 km.
Com. Chonchocoro (Zona Kiluyo)	Dragado de río	2 km.
Com. Quinamaya	Dragado de río	2 km.
Com. Hilata San Jorge	Dragado de río	4 km.
Com. Hilata Arriba	Dragado de río	2 km.
<b>TOTAL : 10 COMUNIDADES</b>		<b>TOTAL: 39 KM.</b>



# MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRACCION DISTRITO-3

**PRESUPUESTO**

**EJECUTADO**

**%**

**350.000**

**345.432**

**98,7 %**

CAN.	MAQUINARIA Y/O MOVILIDAD
2	EXCAVADORAS HIDRAULICAS
2	MOTONIVELADORAS
2	RETROEXCAVADORAS
2	VOLQUETAS
3	CAMIONETAS
1	VAGONETA
1	MAQUINARIA PERFORADORA DE POZO
1	TRACTO CAMION PERFORADORA DE POZO
1	CARRO LOBOY
1	CARRO CANASTA



# MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRACCION DISTRITO-3

DETALLE	MONTO
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURIA PARA EXCAVADORA HIDRÁULICA E-215	2.261
ADQUISICIÓN DE ACEITES, FILTROS Y OTROS PARA RETROEXACAVADORA B110B	16.483
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA HILUX PLACA 3037 XPY	16.500
ADQUISICION DE ACEITES, FILTROS Y OTROS PARA RETROEXCAVADORA B95B	16.483
ADQUISICION DE ACEITES, FILTROS Y OTROS VOLQUETA HINO 2935 REC	13.514
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI 2294 BSI	19.700
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTONIVELADORA RG200	24.685.
ADQ. DE LLANTAS Y CAMARAS PARA LA CAMIONETA HILUX 3037XPY, RETRO EXCAVADORA B95B Y B110	13.500
ADQUISICION DE ACEITES, FILTROS Y OTROS PARA EXCAVADORA HIDRAULICA 215B	33.553
ADQ. DE LLANTAS Y CAMARAS Y PONCHILLOPARA LA VOLQUETA HINO 2935 REC	13.920
ADQUISICION DE ACEITES, FILTROS Y OTROS PARA LA VOLQUETA HINO 2311 ZPG	12.055
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA VOLQUETA HINO 2311 ZPG	34.077



# MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRACCION DISTRITO-3

DETALLE	MONTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VAGONETA REGIUS 3623 PEI	19.950
ADQUISICION DE ACEITES, FILTROS Y OTROS PARA MOTONIVELADORA RG-200B	19.437
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PERFORADORA DE POZO	23.361
ADQUISICION DE ACEITES Y FILTROS PARA EXCAVADORA HIDRAULICA E215B	18.117
ADQUISICION DE LLANTAS CON CAMARA Y PONCHILLO PARA VOLQUETA 2935 REC	6,960
ADQUISICIÓN DE ACEITES, FILTROS Y OTROS PARA CAMIONETA HILUX 3037 XPY, CAMIONETA MITSUBISHI 2294 BSI, VAGONETA REGIUZ 3623 PEI Y CAMIONETA MAZDA 672 TZT	6.146
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRACTO CAMION PERFORADORA DE POZO	7,530
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA B110B NEWHOLLAND	19,985
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA MAZDA CON PLACA 672 TZT	7215
<b>TOTAL BS.-</b>	<b>345.432,00</b>



# MAQUINARIA - D3

EQUIP. MAQUINARIA Y  
EQUIPO GAM DE VIACHA

PRESUPUESTO

1,934,008

EJECUTADO

1,928,000

%

99,7

ADQUISICIÓN DE  
MOTONIVELADORA PARA  
MEJORAMIENTO DE  
CAMINOS D-3

BENEFICIARIOS:

65  
COMUNIDADES





GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA

**DIRECCIÓN DE  
SANEAMIENTO  
BASICO**





GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA

**DIRECCIÓN DE  
SANEAMIENTO  
BASICO  
DISTRITO -1**



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

AMPLIACIÓN SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL , C/ FRANZ  
TAMAYO y C/ ALFREDO QUISBERT, Z/21 DE ENERO D-1

	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
GESTIÓN 2019c	Adquisición de Materiales de Ferretería, plomería, Tapas de Cámara de Inspección y Tapas de Sumideros y otros	<b>84.455,60</b>	100 %	Alcantarillado Sanitario = 195 ml Alcantarillado Pluvial = 340 ml
	Alquiler de Retroexcavadora	<b>9.240,00</b>	100%	42 horas trabajo para 436 ml
	Total	<b>93.695,60</b>		



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## MEJORAMIENTO SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL , C/ORURO Z/VILLA REMEDIOS D-1

GESTIÓN 2019	Descripcion	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	Se realizo solo el tendido del Alcantarillado Pluvial de 8 pulgadas	76.156,48	100 %	Alcantarillado Pluvial = 175 ml



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## AMPLIACIÓN SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, C/ PROGRESO Z/ SAN SALVADOR D-1


GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DE MANERA DELEGADA	99.177,56	100 %	Alcantarillado Pluvial = 280 ml
	OBRA DE MANERA DIRECTA GAMAV – APOYO TECNICO DSB CON 3 OBREROS	19.833,00	100%	Alcantarillado pluvial = 110 ml
	Adquisición de Materiales de Ferretería, plomería, Tapas de Cámara de Inspección, Tapas de Sumideros y áridos			
	Total	119.010,56		



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## MEJORAMIENTO SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, C/ HUMACHUA ENTRE C/HERNANDO SILES Y AV. 20 DE OCTUBRE Z/HUMACHUA D-1

	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
GESTIÓN 2019	OBRA DE MANERA DELEGADA	59.811,82	100 %	Alcantarillado Sanitario = 105 ml Alcantarillado Pluvial = 85 ml
	APOYO DEL GAMV CON – TECNICO DSB Y MAQUINARIA PARA AVARCAR MAYOR LONGITUD			
	ENCOORDINACION CON VECINOS DE LA ZONA SEREALIZO EL RELLENO DE ZANJA			

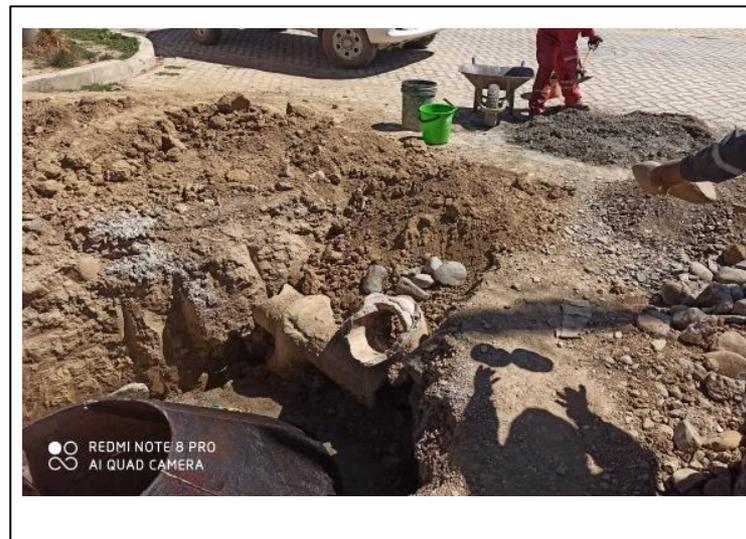

# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## MEJORAMIENTO SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO, C/ HUMACHUA Z/ LOS ÁNGELES D-1

GESTIÓN 2019	DESCRION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DE MANERA DELEGADA	99.988,87	100 %	Alcantarillado Sanitario = 400 ml



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

MEJORAMIENTO SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL , AV. HUMACHUA ENTRE C/ HERNANDO SILES Y C/ KOLLASUYO Z/ HUMACHUA I D-1

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DE MANERA DELEGADA	109.973,52	100 %	Alcantarillado Pluvial = 190 ml



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, C/ AGUA DE LA VIDA Y MURURATA Z/ BOLÍVAR D-1

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DE MANERA DELEGADA	69.072,31	100 %	Alcantarillado Pluvial = 174 ml



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## MANTENIMIENTO DE TAPAS Y SUMIDEROS, DISTRITO 1

	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
GESTIÓN 2019	Compra de tuberías de 8" y 6", tapas de cámara de inspección , tapas de sumidero y accesorios para agua potable	48.978,00	100 %	Refacción de: <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 sumideros</li><li>• 20 tapas de cámaras de inspección y</li><li>• Tuberia de Alc S y P = 220 ml</li><li>• Tuberia de Agua Potable = 170 ml</li></ul>



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

\* Sector Este z/Plan 03 Jose Ballivian

\* Sector Norte z/Las Retama

\* Sector Este z/Jose Ballivian

\* Sector Norte Urb. Porvenir

\* Sector Este Urb. Santiago

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	.TOTAL DE LOS ESTUDIOS		49.100,00	100 %



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR ESTE URB. SANTIAGO D-1

	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
GESTIÓN 2019	OBRA DELEGADA (Sanitario, C/4 entre C/ Irpa Chico y Av. Periférica, y C/Urquizo entre C/4 y Av. Villa Remedios)	155.351,92	86,75 %	312 Metros de Alc. Sanitario.
	OBRA DELEGADA (Sanitario, C/Urquizo entre Av. Villa Remedios y C/Costas)	99.971,00	100%	264 metros de Alc. Sanitario.



# PROGRAMA (SALUD-EDUCACION- ETC.)

## CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR NORTE URB. PORVENIR D-1 (CALLE SANTA CRUZ Y C/ARCO IRIS ENTRE C/ALIANZA Y C/11)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DE MANERA DELEGADA	144.990,64	84 %	Alcantarillado Pluvial = 438 ml



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR ESTE Z/SANTO IPIÑA D-1

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DE MANERA DELEGADA	99.884,39	100 %	Alcantarillado Pluvial = 301 mL



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR ESTE Z/14 DE NOVIEMBRE  
D-1

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DELEGADA	48.654,71	100 %	Alcantarillado Sanitario = 178 ml




# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR NORTE Z/EDUARDO AVAROA D-1

	DESCRIPCIÓN	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
GESTIÓN 2019	OBRA DE MANERA DIRECTA APOYO TECNICO Y 3 OBREROS		100 %	Alcantarillado Sanitario = 95 ml Alcantarillado Sanitario = 55 ml
	Adquisición de Materiales de Ferretería, plomería, Tapas de Cámara de Inspección y Tapas de Sumideros y otros	24.039,50	100 %	
	Alquiler de Retroexcavadora	19.350,00	100%	86 horas
	Total	43, 389,5		





# GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA

## DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BASICO DISTRITO -1 PREVENCIÓN DE RIESGOS

INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2020



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL (ADQUISICIÓN MATERIALES) CALLE LETANIAS

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	3 LOTES -TUBOS PREFABRICADOS -ARIDOS -FERRETERIA	49.993,00	100 %	95m. TUBERIA DE HORMIGON DE 400mm. 5 CAMARAS DE INSPECCION CLAVOS Y ALAMBRES

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	2 LOTES -TUBOS PREFABRICADOS -ARIDOS	49.990,00	100 %	100m. TUBERIA DE HORMIGON DE 400mm. 5 CAMARAS DE INSPECCION

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	1 LOTE CEMENTO Y TUBERIA PVC	49.996,00	100 %	216m. DE TUBERIA 10" PVC 102m. DE TUBERIA 8" PVC 148 BOLSAS DE CEMENTO

# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

(SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS POR SIFONAMIENTO DE LA C. LETANIAS ENTRE C. SUCRE Y C. INDEPENDENCIA)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	INDICADOR FISICO
	2 ALBAÑILES 1 PLOMERO 1 AYUDANTE	49975,41	100%	TRABAJOS REALIZADOS A 3.80 METROS PROMEDIO DE PROFUNDIDAD, APUNTALAMIENTO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE TUBERIA DE HORMIGON Y PVC CONSTRUCCION DE CAMARAS Y SUMIDEROS Y OTROS



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

(SERVICIO DE MANO DE OBRA, REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS POR SIFONAMIENTO DE LA C/ LETANIAS ENTRE AV. INGAVI Y C/ SUCRE )


GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	INDICADOR FISICO
	2 ALBAÑILES 1 PLOMERO 1 AYUDANTE	49.970,47	100%	TRABAJOS REALIZADOS A 4,30 METROS PROMEDIO DE PROFUNDIDAD, APUNTALAMIENTO DE SEGURIDAD, INSTALACION DE TUBERIA DE HORMIGON Y PVC CONSTRUCCION DE CAMARAS Y SUMIDEROS Y OTROS



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

(ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIÓN DE SIFONAMIENTO EN LA CALLE LETANIAS ENTRE C/ SUCRE Y AV, INGAVI D-1)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	INDICADOR FISICO
		217 HORAS	49.910,00	100%
GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	INDICADOR FISICO
	48 HORAS	19,152,00	100%	C/SUCRE Y AV. INDEPENDENCIA MOVIMIENTO DE TIERRAS DE 154m3 PARA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE

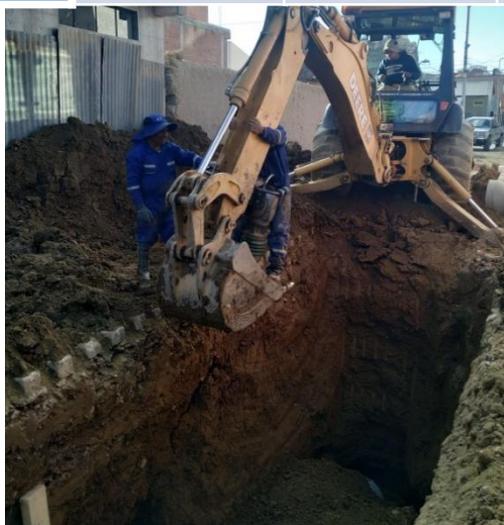

# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, (ALQUILER DE TORNAMESA, RIO KELCATA SECTOR COMUNIDAD MAMANI)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	110 HORAS	49.390,00	100 %	DRAGADO y LIMPIEZA DE RIO DE RIO = 1.550 ml



# PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES)

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, (SERVICIO DE MANO DE OBRA, REFACCION DE CAMARA DE INSPECCION C/PINILLA ESQ. C/PANDO D-1)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	REONSTRUCCION DE CAMARA TENDIDO DE TUBERIA DE HORMIGON EXCAVACION Y RELLENO	19988,62	100 %	2 CAMARA ALCANTARILLADO SANITARIO = 12 ML DE H <sup>3</sup> A <sup>3</sup> DE 16 " Y 12 ML DE PVC 10"



# PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES)

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, (SERVICIO DE MANO DE OBRA, REFACCION DE CAMARA DE INSPECCION C/ COCHABAMBA ENTRE AV. 9 DE ABRIL Y AV. 16 DE JULIO)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	RECONSTRUCCION DE CAMARA TENDIDO DE TUBERIA DE HORMIGON EXCAVACION, RELLENO Y REENLOSETADO	19988,62	100 %	4 M DE REENLOCETADO 1 CARA PROFUNDIDAD 3,5 M



# PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES)

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, (ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA Y HERRAMIENTAS)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE ALCANTARILLADO EN VIACHA	19,908,62	100 %	PALAS, PICOTAS, CARRETILLAS, CALDES, CUCHARONES DE LIMPIEZA, COMBOS, ETC.



# PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES)

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, (ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS SERVIDAS, URB. C.B.N. DISTRITO 2)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	LIMPIEZA Y DRAGADO DEL CANAL DE DESAGUEN .	40.304,00	100 %	DESAGUE DEL ALCANTARILALDO PLUVIAL = 250 ML 176 HORAS



# PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES)

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, (ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PARA REFACCIÓN DE SIFONAMIENTOS)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	COMPRA DE TUBERIA DE 6" Y 8"	16.290,00	100 %	Tuberia PVC SDR-41D=8 = 18 BARRAS Tuberia PVC SDR-41 d-6 = 18 BARRAS



# PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES)

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, (ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLOMERIA Y TUBERIAS AV. VILLA REMEDIOS ENTRE AV. SIMON BOLIVAR Y C. SAAVEDRA D-1)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DIRECTA GAM - VIACHA	• Maquinaria • Personal técnico y 4 obreros • EMAPAV apoya con trabajos de plomería	5.680,00 ---	100 % ---



# PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES)

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES SECCIONAL (CONSTRUCCIÓN DRENAJES PLUVIALES PARA PASOS DE VIA, Z/ VILLA MERCEDEZ, Z/BELLA VISTA, D-2)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DELEGADA	11594,89	100 %	Alcantarillado Pluvial = 39 m





# GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA

**DIRECCIÓN DE  
SANEAMIENTO BASICO  
DISTRITO -1  
EJECUCIÓN DE MANERA  
DIRECTA SIN POA**

INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2020



# PROGRAMA (SIN PROGRAMA)

APOYO CONVENIO FEJUVE – EMAPAV

CALLE LETANIAS ENTRE AV. INGAVI Y INDEPENDENCIA

GESTIÓN 2019	ENTIDAD	MONTO POA	DETALLE	% EJECUCIÓN FÍSICA	INDICADOR FISICO
	GAMV - DSB	0,00	APOYO TECNICO Y 4 ALBAÑILES	100 %	210 m. CALLE LETANIAS ENTRE AV. INGAVI Y INDEPENDENCIA
	EMAPAV	-	MATERIALES Y PLOMERIA		
	VECINOS	-	MANO DE OBRA		



# PROGRAMA (SIN PROGRAMA)

APOYO CONVENIO FEJUVE – EMAPAV

ZONA JOSE BALLIVIAN

GESTIÓN 2019	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	APOYO TECNICO GAMV – 3 OBREROS Y MAQUINARIA	0,00	0 %	AGUA POTABLE = 320 ml
	APOYO DE EMAPAV – PLOMERIA Y MATERIALES			



# PROGRAMA (SIN PROGRAMA)

APOYO CONVENIO FEJUVE – EMAPAV

ZONA 21 DE ENERO

GESTIÓN 2019	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	APOYO TECNICO GAMV – 3 OBREROS Y MAQUINARIA	0,00	0 %	AGUA POTABLE = 580 ml
APOYO DE EMAPAV – PLOMERIA Y MATERIALES				



# PROGRAMA (SIN PROGRAMA)

## APOYO CONVENIO FEJUVE – EMAPAV

### ZONA VILLA REMEDIOS

GESTIÓN 2019	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	APOYO TECNICO GAMV – 3 OBREROS Y MAQUINARIA	0,00	0 %	AGUA POTABLE = 90 ml
	APOYO DE EMAPAV – PLOMERIA Y MATERIALES			



# PROGRAMA (SIN PROGRAMA)

## APOYO CONVENIO FEJUVE – EMAPAV

### ZONA SANTIAGO

GESTIÓN 2019	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	APOYO TECNICO GAMV – 3 OBREROS Y MAQUINARIA	0,00	0 %	AGUA POTABLE = 320 ml
	APOYO DE EMAPAV – PLOMERIA Y MATERIALES			



# PROGRAMA (SIN PROGRAMA)

## APOYO CONVENIO FEJUVE – EMAPAV

### BARRIO CERVECERO

GESTIÓN 2019	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	APOYO TECNICO GAMV – 3 OBREROS Y MAQUINARIA	0,00	0 %	AGUA POTABLE = 480 ml
	APOYO DE EMAPAV – PLOMERIA Y MATERIALES			



# PROGRAMA (SIN PROGRAMA)

## APOYO CONVENIO FEJUVE – EMAPAV

### ZONA LAS RETAMAS

GESTIÓN 2019	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	APOYO TECNICO GAMV – 3 OBREROS Y MAQUINARIA	0,00	0 %	AGUA POTABLE = 530 ml
	APOYO DE EMAPAV – PLOMERIA Y MATERIALES			





GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA

**DIRECCIÓN DE  
SANEAMIENTO  
BASICO -  
DISTRITO - 2**

INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2020



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE C/S/N ENTRE C/"A" Y AV. HACIA EL MAR D-2

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DELEGADA		49074,16	100 %



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

**MANTENIMIENTO VIAL Y CAMINERA DISTRITO 2 (COMPRA DE MATERIALES, TUBERIA PVC J/E E=40 CLASE IND. DIN 2", ACCESORIOS PARA RED AGUA POTABLE ) C/M. PINILLA ENTRE C/JUNIN Y C/ITURRALDE, Z/18 DE NOVIEMBRE**

	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
01	OBRA DE MANERA DIRECTA GAMV	4987,12	100 %	AGUA POTABLE= 120 ml
	APOYO CON 3 OBREROS Y MAQUINARIA GAMV COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PLOMERIA , ACCESORIOS			
	<b>Total</b>	<b>4987,12</b>		



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO, AV. PISAGUA ENTRE PUENTE KALACHACA Y PARAGUAY Z/SANTA BARBARA (CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS, CÁMARAS DE INSPECCIÓN, AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DELEGADA		151.936,61	100 %



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## Mantenimiento de Tapas, Cámaras y Sumideros, d-2

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	COMPRA DE TAPAS PARA CAMARAS DE ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS	19480	100 %	COMPRA DE 31 pzs TAPAS DE CAMARAS Y SUMIDEROS



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, C/S/N ENTRE C/"A" Y C/"B" URB. PLAZA TRIANGULAR UYUNI (COMPRA DE MATERIAL)

GESTION 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DE MANERA DIRECTA GAMV	2.656,00	100 %	ALCANTARILLADO SANITARIO = 43ml
	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA			
	APOYO TECNICO DSB, OBREROS G.A.M.V.			



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

**AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO (COMPRA DE MATERIALES, TUBERIA PVC SDR-41 J/E D=8", TUBERIA PVC SDR-41 J/E D=6"), C/BOQUERON ENTRE TUPAC KATARI Y C/S/N Z/BELLA VISTA**

	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
01	OBRA DE MANERA DIRECTA GAMV	9976,00	100 %	ALCANTARILLADO PLUVIAL= 61 ml ALCANTARILLADO SANITARIO= 61 ml
	APOYO CON 3 OBREROS Y MAQUINARIA GAMV			
	COMPRA DE MATERIALES TUBERIA			
	Total	9976,00		



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO AV. DORIA MEDINA ENTRE C/COLLANA Y CARRETERA COLQUENCHA

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	OBRA DELEGADA		70.498,00	100 %






# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

**CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DISTRITO 7"  
(ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSIÓN ZONA OESTE CONSULTORIA POR PRODUCTO)**

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
		CONSULTORIA POR PRODUCTO	50.000,00	100 %

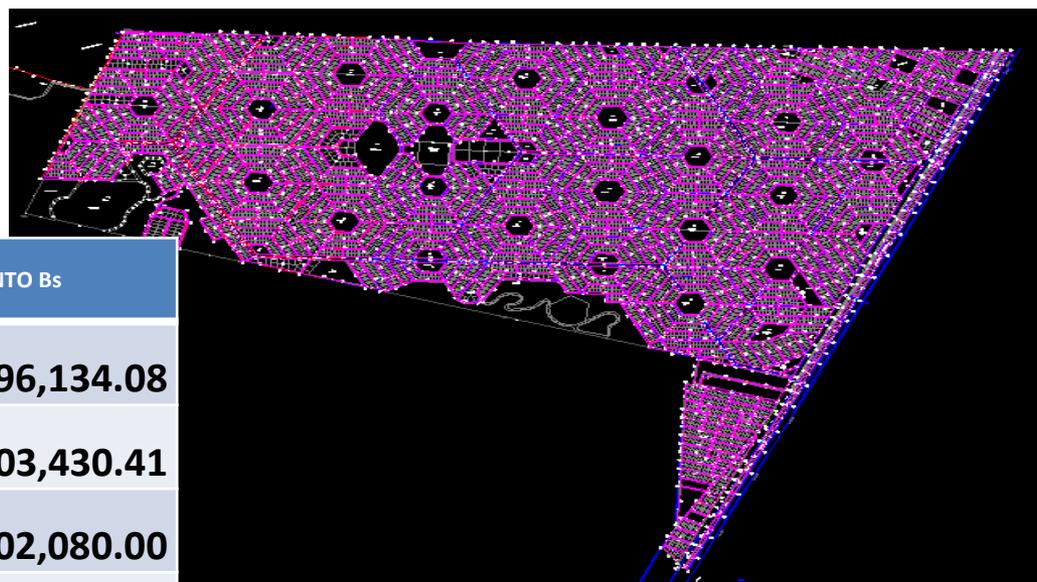


ÍTEM	DESCRIPCION	MONTO Bs
1	INFRAESTRUCTURA	83,596,134.08
2	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	103,430.41
3	SUPERVISION DE OBRAS	2,002,080.00
4	DESCOM	692,581.27
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>86,394,225.76</b>

# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

**CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DISTRITO 7”  
(ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSIÓN ZONA ESTE CONSULTORIA POR PRODUCTO)**

GESTIÓN 2019	DESCRIPCION	MONTO DE CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	INDICADOR FISICO
	CONSULTORIA POR PRODUCTO	50.000,00	100 %	PRODUCTO

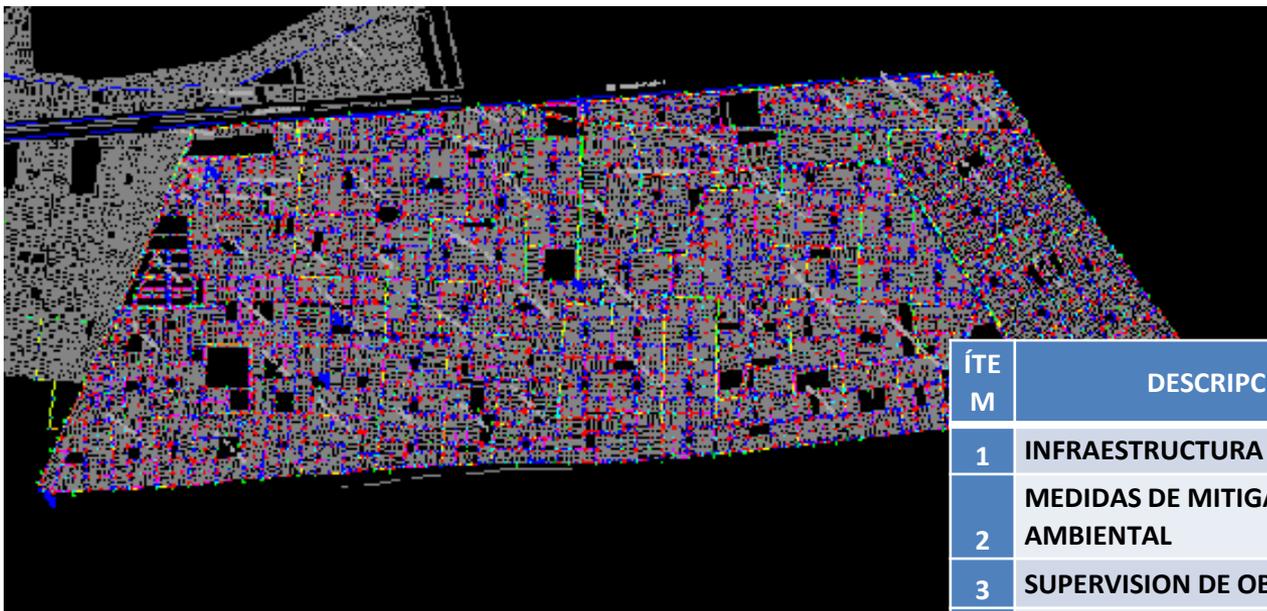

ÍTE M	DESCRIPCION	MONTO Bs
1	INFRAESTRUCTURA	83,625,335.39
2	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	94,806.16
3	SUPERVISION DE OBRAS	2,002,080.00
4	DESCOM	790,487.26
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>86,512,708.81</b>

# SANEAMIENTO BASICO

**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, DISTRITO 6 (COMPRA DE MATERIALES: TUBO DE PVC Y ACCESORIOS)**

**EL PROYECTO REFIERE A COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

## URBANIZACIONES BENEFICIADAS

Nº	URBANIZACION	METROS
1	LA FLORIDA	486
2	JOSE BALLIVIAN B	164,1
3	SAN CIPRIANO	260,39
4	12 DE MAYO A	250,88
5	WARA	368,01
6	12 DE MAYO B	537,17
	<b>TOTAL =</b>	<b>2066,55</b>

**PRESUPUESTO**

**50.000**

**EJECUTADO**

**49.800**

**%**

**99,6**



Compra de materiales Agua Potable tubería PVC E-40 D=2"



Entrega de tuberías PVC E-40 Urb. San cirpiano Distrito 6

# SANEAMIENTO BASICO

**AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, URBANIZACIÓN CENTRAL VILIROCO DISTRITO 6 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)**

**PRESUPUESTO**

**6.200**

**EJECUTADO**

**5.904**

**%**

**95,23**

**SE REALIZA LA ENTREGA DE MATERIALES DE PVC E-40 D=2" PARA AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE**



Entrega de materiales de PVC DISTRITO 6



Excavación de zanja para tendido de tubería de PVC DISTRITO 6

# SANEAMIENTO BASICO

**CONSTRUCCIÓN CASETA DE BOMBEO, URBANIZACIÓN PEDRO DOMINGO MURILLO, DISTRITO 6 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)**

**PRESUPUESTO**

**21.000**

**EJECUTADO**

**19.967,84**

**%**

**95,08**

**SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO PARA MEJORARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**



Caseta de bombeo Urb. P.D.M. DISTRITO 6



Instalación de caja de medidor DISTRITO 6

# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

**CONST. SISTEMA DE AGUA  
POTABLE ZONA COPANCARA  
COM. MURUHAMAYA D-3**

**PRESUPUESTO**

**135.400,00**


**EJECUTADO**

**84,755,00**

**%**

**62,6**

**ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA SISTEMA DE BOMBEO – 350 ML LINEA  
ELECTRICA TRIFASICA**

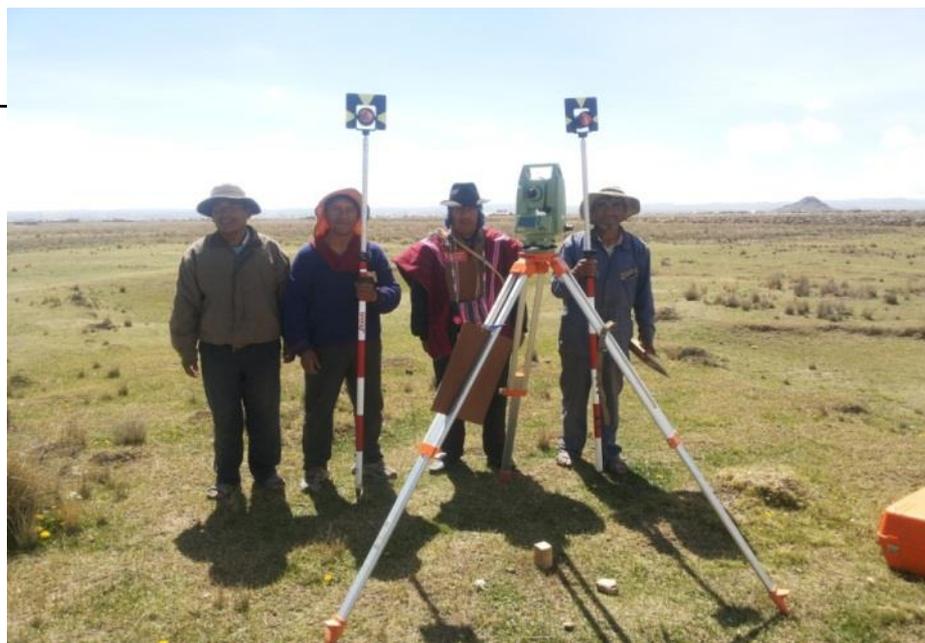

# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

**AMPL. SISTEMA DE AGUA  
POTABLE COMUNIDAD CONIRI  
UNKA SUKA D-3**

**PRESUPUESTO**

**76,964,00**

**EJECUTADO**

**76,015,00**

**%**

**98,8**

**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA SISTEMA DE  
BOMBEO 2 Y 3 – 280 ML LINEA ELECTRICA MONOFASICA**



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

**CONST. SISTEMA DE AGUA  
POTABLE COM. TONCOPUJIO**

**D-3**

**PRESUPUESTO**

**72,600,00**

**EJECUTADO**

**72,441,00**

**%**

**99,8**

**ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA – 820 ML (TUBERIA DE PVC 2”  
E=40) – MANO DE OBRA LOCAL**



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

**CONST. SISTEMA DE AGUA  
POTABLE. COM. JEKERI. D-3**

**PRESUPUESTO**

**39,256,00**

**EJECUTADO**

**39,098,00**

**%**

**99,6**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA – 2.040 ML (TUBERIA DE PVC 2” E=40) –  
MANO DE OBRA LOCAL**



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

## SONDEO ELECTRICO VERTICAL PARA PERFORACION DE POZOS

PRESUPUESTO

50,000,00

EJECUTADO

50,000,00

%

100

27 PUNTOS – 9 COMUNIDADES - 1.- COLINA BLANCA 2.- JALSURI 3.- CALLISAYA 4.-  
ANCARA 5.- ACHICA ARRIBA 6.- CONTORNO PALLCOSO 7.- HILATA CENTRO 8.-  
CHALLAJAHUIRA 9.- CHONCHOCORO z/CENTRAL



# PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO) - CONVENIO

## CONST. SIST. AGUA POTABLE CONIRI (VIACHA)

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
2.003.029,00	1.802.142,97	89,97

**POGRAMA: MIAGUA IV**  
(CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA  
POTABLE COMUNIDAD CONIRI SISTEMA 1)

### PRESUPUESTO REQUERIDO

M.M.A y A.	1,999,929,68 – 86,97 %
G.A.M.V.	299,633,03 – 13,03 %
<b>TOTAL</b>	<b>2,299,562,71 – 100%</b>
<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>101 FAMILIAS.</b>



# CONVENIO MDRyT - G. A. M. VIACHA (1)

## PROGRAMA: NUESTRO POZO

DETALLE	PRESUPUESTO	%
<b>M D R y T</b>	<b>3,177,857,66</b>	<b>50,00</b>
<b>G A M V</b>	<b>3,177,857,66</b>	<b>50,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,355,713,02</b>	<b>100</b>

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. MURAMAYA         | 10. VILLA SANTIAGO DE CHACOMA |
| 2. PALLINA CENTRO   | 11. JEQUERI                   |
| 3. CONIRI SIST. 2   | 12. SURUSAYA SURIPANTA        |
| 4. CONIRI           | 13. IRPUMA IRPA GRANDE        |
| 5. CHONCHOCORO      | 14. CHUSÑUPA                  |
| 6. TONCOPUJIO       | 15. CONTORNO BAJO             |
| 7. HILATA SAN JORGE | 16. VILLA ARRIENDO            |
| 8. CHACOMA ALTA     | 17. PAN DE AZUCAR             |
| 9. HICHURAYA GRANDE |                               |



**GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA**



**ALUMBRADO  
PUBLICO**



# ALUMBRADO PUBLICO DIST. 1

## MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DIST. 1 POA 2019

PRESUPUESTO

50.000.00

EJECUTADO

46.975.00

%

100

### LAMPARAS

400 WATTS. (24 P), 250W HM (24 P), 250W Na (100 P), 150 W HM (24 P) y 70W HM (24 P)

### BALASTOS

400 WATTS. (6 PIEZAS), 250W (12 P), 150W (12 P) y 70W (6 PIEZAS)

FOTOCONTROLES (115 PIEZAS), IGNITORES (50 PIEZAS) y CAPASITORES (15 PIEZAS)

## MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 423 PIEZAS



# ALUMBRADO PUBLICO DIST. 1

**ADQUISICION DE LUMINARIAS,  
POSTES D-1**

**PRESUPUESTO  
200.000**

**EJECUTADO  
195.272**

**%  
100**

**LUMINARIAS LED DE 100W.  
BRAZOS METALICOS (88 PIEZAS)**

**(88 PIEZAS)**



## ALUMBRADO PUBLICO DIST. 2

### MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DIST. 2 POA 2019

PRESUPUESTO

50.000.00

EJECUTADO

46.975.00

%

100

#### LAMPARAS

400 WATTS. (24 P), 250W HM (24 P), 250W Na (100 P), 150 W HM (24 P) y 70W HM (24 P)

#### BALASTOS

400 WATTS. (6 PIEZAS), 250W (12 P), 150W (12 P) y 70W (6 PIEZAS)

FOTOCONTROLES (115 PIEZAS), IGNITORES (50 PIEZAS) y CAPASITORES (15 PIEZAS)

### MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 423 PIEZAS




## ALUMBRADO PUBLICO DIST. 2

**ADQUISICION DE LUMINARIAS,  
POSTES D-2 PARA LA AV. DORIA  
MEDINA ZONA FABRIL "A"**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
200.000.00	136.000.00	100

**POSTES DECORATIVOS DE 10.50 MTS. (21 PIEZAS)  
LUMINARIAS LED DE 200W. (21 PIEZAS)  
EXCAVACION DE HOYOS Y VACIADO DE CANASTILLOS (21 P)**



# ALUMBRADO PUBLICO

## ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y POSTES, DISTRITO 6

PRESUPUESTO

150.000

EJECUTADO

141.956

%

94,64

AQUISICION DE 84 LUMINARIAS LED - 84 POSTES – 19 POSTES DE MADERA



Entrega a Urb. Beneficiarias  
Urb. Jose Ballivian B DISTRITO 6



Instalación de luminarias LED Urb. Flor de Rosas

# ALUMBRADO PUBLICO

**MANTENIMIENTO DE  
LUMINARIAS DISTRITO 6,  
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS  
ELÉCTRICOS**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
50.000	49.970	94,64

**AQUISICION DE 194 LUMINARIAS LED Y ACCESORIOS**



Mantenimiento de calles y avenidas Urb.  
Jose Ballivian "A" Distrito 6

# ALUMBRADO PUBLICO


**MANTENIMIENTO DE  
LUMINARIAS DISTRITO 6,  
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS  
ELÉCTRICOS FASE II**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
40.000	39.995	99,99

**145 LUMINARIAS LED Y POSTES**



Mantenimiento de la red de alumbrado  
Publio en Horario Nocturno Urb. Nueva  
Esperanza DISTRITO 6

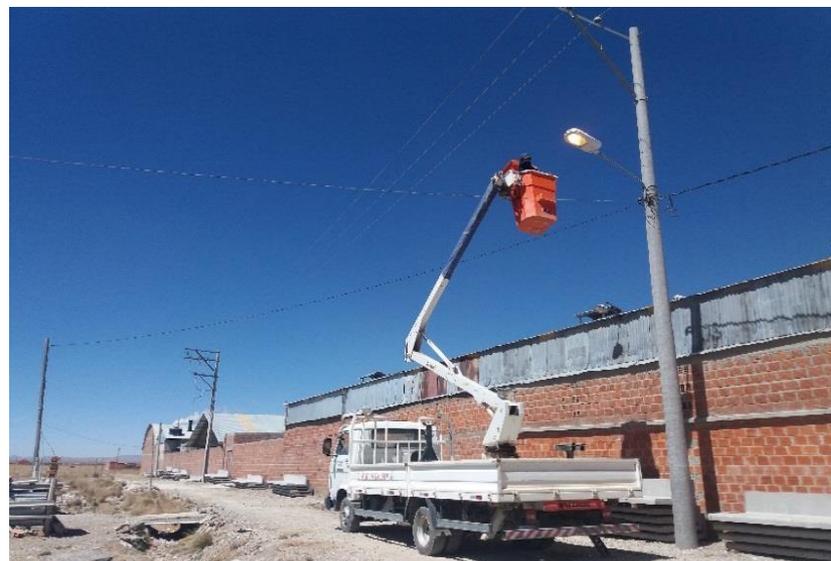

Mantenimiento de la red de alumbrado  
Publio Urb. 15 de Noviembre DISTRITO 6

# PROGRAMA (ALUMBRADO PUBLICO)

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y  
POSTES DISTRITO 7 FASE I

PRESUPUESTO

200.000

EJECUTADO

197.665

%

98.83

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y POSTES DISTRITO 7- FASE I

ACTIVIDADES -ADQUISICION DE 130 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 250W Y BRAZOS  
METALICOS DE SUJECION DE LUMINARIA - SECTOR TILATA-



# PROGRAMA (ALUMBRADO PUBLICO)

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y  
POSTES DISTRITO 7 FASE II

PRESUPUESTO

200.000

EJECUTADO

197.925

%

98.96

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y POSTES DISTRITO 7- FASE II

ACTIVIDADES -ADQUISICION DE 130 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 250W Y BRAZOS  
METALICOS DE SUJECION DE LUMINARIA - SECTOR MARISCAL SANTA CRUZ -



# PROGRAMA (ALUMBRADO PUBLICO)

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y  
POSTES DISTRITO 7 FASE III

PRESUPUESTO

150.000

EJECUTADO

148.960

%

99.30

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y POSTES DISTRITO 7- FASE III

ACTIVIDADES -ADQUISICION DE 98 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 250W Y BRAZOS METALICOS DE SUJECION DE LUMINARIA - SECTOR TILATA Y MARISCAL SANTA CRUZ -



# PROGRAMA (ALUMBRADO PUBLICO)

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y  
POSTES SECCIONAL

PRESUPUESTO

50.000

EJECUTADO



49.500

%

99

## PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y POSTES SECCIONAL

ACTIVIDAD -ADQUISICION DE 33 LUMINARIAS LED DE 60W/230VAC Y BRAZOS METALICOS DE SUJECION SECTOR TILATA AURELIA II SECTOR A-B, NUEVA TILATA UV.3,10 DE NOVIEMBRE, TILATA UV 1 ,BLOQUE 6Y7 .TILATA UV D,VILLA CALACOTO,SAN IGNACION))

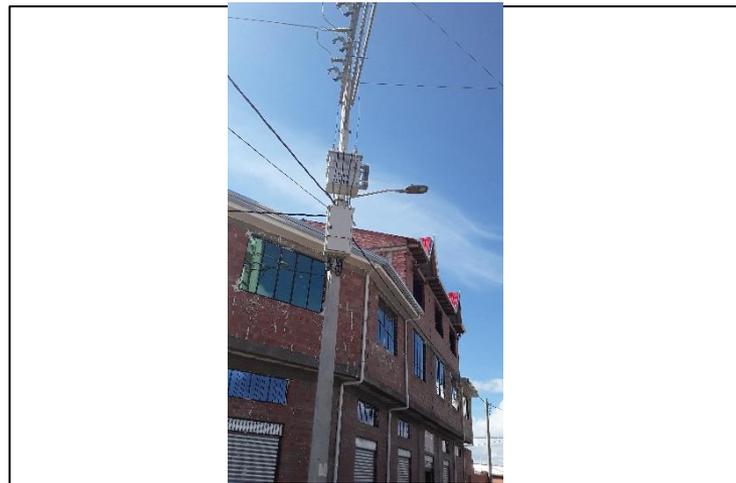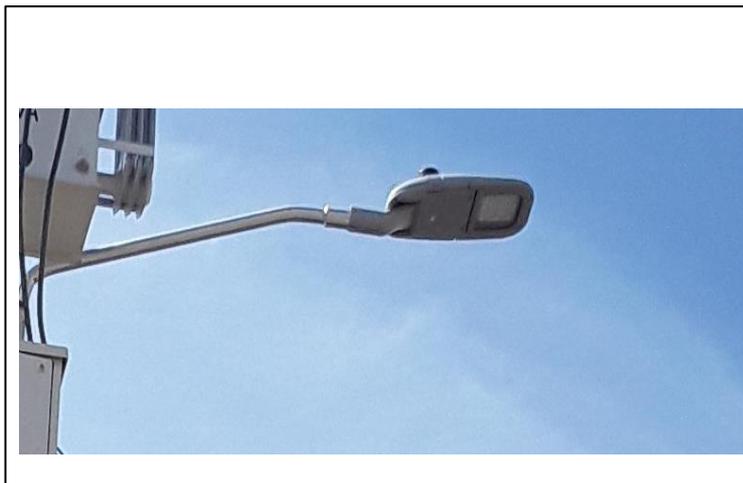

# PROGRAMA (ALUMBRADO PUBLICO)

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y  
POSTES SECCIONAL

PRESUPUESTO

50.000

EJECUTADO


49.500

%

99

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y POSTES SECCIONAL

ACTIVIDAD -ADQUISICION DE 33 LUMINARIAS LED DE 60W/230VAC Y BRAZOS METALICOS DE SUJECION SECTOR MARISCAL SANTA CRUZ UV. 2-B,5-H,6-J,1-F,2-H,6-G,7-I,4-F)

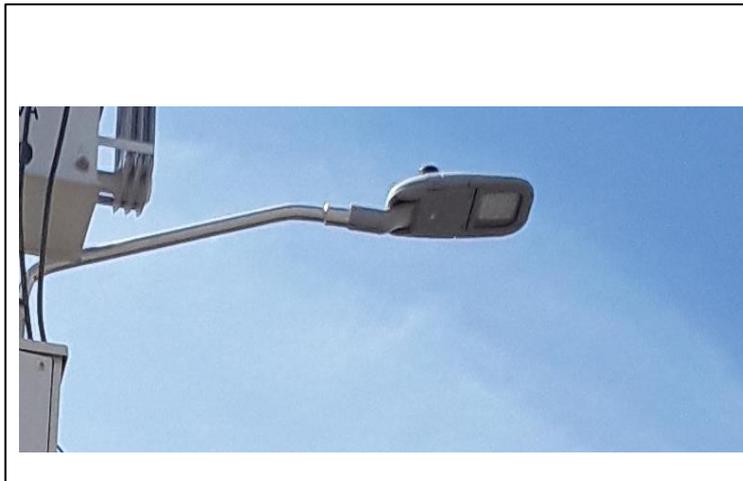

# PROGRAMA (ALUMBRADO PUBLICO)

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y  
POSTES SECCIONAL

PRESUPUESTO

50.000

EJECUTADO


49.500

%

99

## PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y POSTES SECCIONAL

ACTIVIDAD -ADQUISICION DE 33 LUMINARIAS LED DE 60W/230VAC Y BRAZOS METALICOS DE SUJECION SECTOR SECTOR MARISCAL SANTA CRUZ UV. 2-E,3-J,3-B,3-A,1-C,2-A,5-N SECTOR SAN SALVADOR)

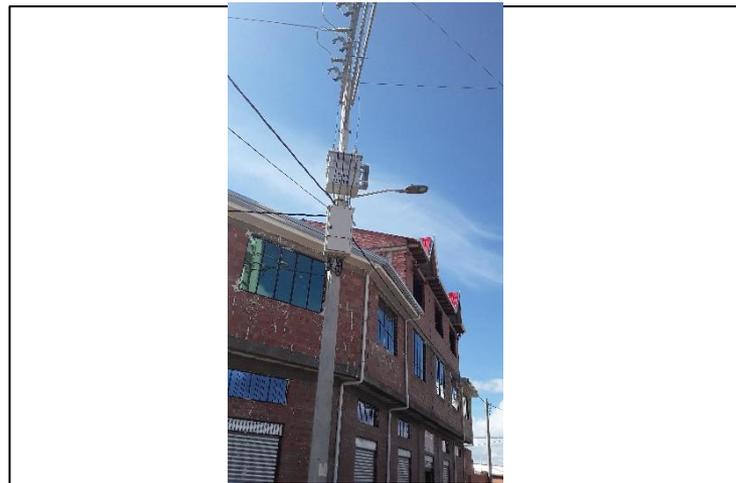

# PROGRAMA (ALUMBRADO PUBLICO)

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y  
POSTES SECCIONAL

PRESUPUESTO

22.700

EJECUTADO

27.700

%

100

PROYECTO ADQUISICION DE LUMINARIAS Y POSTES SECCIONAL SECTOR MARISCAL  
SANTA CRUZ UV. 4-I , 5-H

ACTIVIDAD -ADQUISICION DE 10 LUMINARIAS LED DE 100W/230VAC Y BRAZOS METALICOS DE  
SUJECION SECTOR



## ADQUISICION DE LUMINARIAS Y POSTES D-3

PRESUPUESTO

150.000

EJECUTADO

149.750,00

%

99,8 %

MARKA	CANT.
MARKA IRPA CHICO	27
MARKA ACHICA	15
MARKA BATALLA DE INGAVI	12
MARKA CONTORNO	10
MARKA CONIRI	7



## ADQUISICION DE LUMINARIAS Y POSTES D-3

PRESUPUESTO

150.000

EJECUTADO

149.750,00

%

99,8 %

MARKA	CANT.
MARKA IRPA GRANDE	12
MARKA VILLA SANTIAGO DE CHACOMA	2
MARKA VILLA ANCARA	4
URBANIZACIONES D-3	33
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL 122</b>



**GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA**



**ELECTRIFICACION**



# PROGRAMA (ELECTRIFICACIÓN) - CONVENIO

**CONSTRUCCION ELECTRIFICACION  
AMPLIACION, COM. CONIRI D-3**

**PRESUPUESTO**

**368,553,25**

**EJECUTADO**

**368,553,25**

**%**

**100**

**PROGRAMA: ELECTRICIDAD PARA VIVIR BIEN**  
**25,8 KM CONSTRUIDOS DE ELECTRIFICACION RURAL**

## PRESUPUESTO CONTRAPARTES

<b>G.A.D.L.P.</b>	<b>859,957,58</b> <b>70 %</b>
<b>G.A.M.V.</b>	<b>368,553,25</b> <b>30 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,228,510,83</b> <b>100%</b>
<b>BENEFICIARIOS:</b>	<b>118 FAMILIAS</b>


**GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ**  
 GESTIÓN: FÉLIX PATZI PACO Ph. D.  
 Gobernador del Departamento de La Paz

**OBRA:** "EXTENSIÓN DE RED ELECTRICA PARA EL MUNICIPIO DE VIACHA"

**PROYECTO:** "CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN CONIRI"

SECRETARIO : Ing. Oscar Antonio Pabon Limachi  
 DIRECTOR : Ing. Marcelo Jesus Harriague Alvarez  
 FISCAL DE OBRA : Ing. Juan Antonio Benitez Tejada  
 EMPRESA CONSTRUCTORA : ENRIL SRL.  
 SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Rogelio Pusarico Yujra  
 MONTO DE LA OBRA : 1. 146. 157, 48 Bs.  
 FECHA DE INICIO : 15 de Enero 2019



# PROGRAMA (ELECTRIFICACIÓN) - CONVENIO

**CONSTRUCCION  
ELECTRIFICACION  
COMPLEMENTACION, COM. VILLA  
SANTIAGO DE CHACOMA Y  
JEQUERI D-3**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>776,195,09</b>	<b>776,195,09</b>	<b>100</b>

**PROGRAMA: ELECTRICIDAD PARA VIVIR BIEN**  
**49,9 KM CONSTRUIDOS DE ELECTRIFICACION RURAL**

## PRESUPUESTO CONTRAPARTES

<b>G.A.D.L.P.</b>	<b>1,811,121,88</b> <b>70 %</b>
<b>G.A.M.V.</b>	<b>776,195,09</b> <b>30 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,587,316,97</b> <b>100%</b>
<b>BENEFICIARIOS:</b>	<b>234 FAMILIAS</b>



**GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA**



**DESARROLLO  
AGROPECUARIO**



# PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

**CONSTRUCCIÓN MATADERO  
MUNICIPAL, DISTRITO 1 Y 2**

**MONTO  
CONTRATADO**

**691.120,33**

**EJECUTADO**

**691.120,33**

**%**

**100**

**Trabajos realizados: Complementación de la obra fina del área de faeneo.**



# PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

**CONSTRUCCION PLANTA  
PROCESADORA DE LACTEOS D-3**

**PRESUPUESTO**

**730.000**

**EJECUTADO**

**728.551**

**%**

**99,8**

**CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN OBRA FINA – ADMINISTRACIÓN DELEGADA  
CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA 10.000 LITROS /DIA**



# PROGRAMA SANIDAD ANIMAL (AGROPECUARIO) D-3

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS  
VETERINARIOS ANTIPARASITARIOS Y  
VITAMINAS**

**PRESUPUESTO**

**150.000**

**EJECUTADO**

**149.068**

**%**

**99**

**Nº DE CABEZAS DESPARASITADOS Y  
VITAMINIZADOS: 9.409 BOVINOS,  
16.633 OVINOS Y 539 CAMÉLIDOS.**

**BENEFICIARIOS:**

**60 COMUNIDADES Y  
1.230 FAMILIAS**



# PROGRAMA SANIDAD VEGETAL (AGROPECUARIO) D-3

ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA Y FERTILIZANTE FOLIAR PARA EL CONTROL DE GORGOJO DE LOS ANDES DEL CULTIVO DE PAPA

**1.000 FRASCOS X 250 ML "INSECTICIDA "Y 750 LITROS DE "FERTILIZANTE FOLIAR" TOTAL CULTIVO DE PAPA FUMIGADO 1.000 HA**

**BENEFICIARIOS: 35 COMUNIDADES Y 1750 FAMILIAS**

**PRESUPUESTO**


**150.000**

**EJECUTADO**

**150.000**

**%**

**100**

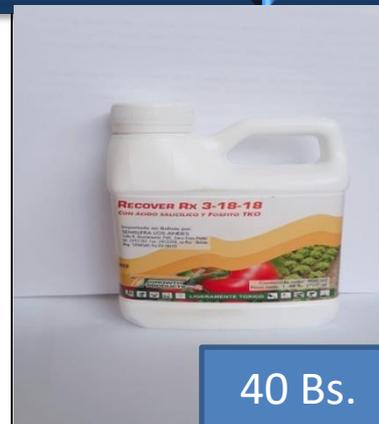

# PROGRAMA PRODUCCION LECHERA (AGROPECUARIO) D-3

**ADQUISICIÓN DE SEMILLA  
FORRAJERA ALFALFA Y FESTUCA  
ALTA**

**PRESUPUESTO**

**100.000**

**EJECUTADO**

**99,960**

**%**

**99**

**ADQUISICIÓN DE:**

**- 867 KG. DE SEMILLA DE ALFALFA**

**58 Ha. SEMBRADO.**

**- 51 KG FESTUCA ALTA**

**3 Ha. SEMBRADO.**

**RENDIMIENTO:**

**5000 KG/HA FORRAJE VERDE ALFALFA**

**500 KG/HA FORRAJE SECO ALFALFA.**

**BENEFICIARIOS:**

**37 COMUNIDADES Y**

**296 FAMILIAS**



# FERIAS AGROPECUARIAS (AGROPECUARIO) D-3

-SERVICIOS DE AMPLIFICACION,  
ADQUISICION DE AFICHES Y  
BANNERS.

PRESUPUESTO

44.702

EJECUTADO

29.762

%

67

## EXPOFERIAS REALIZADAS:

- VILLA SANTIAGO DE CHACOMA
- SAN VICENTE DE COLLAGUA
- HILATA ARRIBA
- EXPOFERIA AGROPECUARIA VIACHA



# CENTRO DE MECANIZACION AGRICOLA (AGROPECUARIO) D-3

**ADQUISICION DE COMBUSTIBLE  
Y MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO.**

**PRESUPUESTO**

**10.000**

**EJECUTADO**

**10.000**

**%**

**100**

**SERVICIO DE MECANIZACION  
AGRICOLA GESTION 2019  
(LEY MUNICIPAL No 010/2018,  
CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIO  
DE MECANIZACION AGRICOLA Y  
SU REGLAMENTO)**

**3 DISCOS  
4 DISCOS  
Arado de punta**

**80 Bs/Hora  
100 Bs./Hora  
120 Bs/Hora**



# CENTRO DE MECANIZACION AGRICOLA (AGROPECUARIO) D-3

## ARADO DE SUELO CON TRES DISCOS

MARKAS	COMUNIDAD	TIPO DE TRABAJO	SUPERFICIE (HECTAREAS)	INGRESO (Bs)
IRPA CHICO	CANAVIRI	ARADO DE SUELO	8	2560
ACHICA	ACHICA ARRIBA	ARADO DE SUELO	1	320
BATALLA DE INGAVI	CHONCHOCORO	ARADO DE SUELO	2	640
CONIRI	QUINAMAYA	ARADO DE SUELO	8	2560
	VILLA PONGUINI	ARADO DE SUELO	8	2560
IRPA GRANDE	MOLLOJAHUA	ARADO DE SUELO	5	2750
	TACAGUA	ARADO DE SUELO	8	2850
	CHACOMA IRPA GRANDE	ARADO DE SUELO	2	1000
V. SANTIAGO DE CHACOMA	CHUSÑUPA	ARADO DE SUELO	1	580
<b>TOTAL</b>	<b>9 COMUNIDADES</b>		<b>43</b>	<b>13260</b>

# CENTRO DE MECANIZACION AGRICOLA (AGROPECUARIO) D-3

## RASTRA NIVELADORA

MARKAS	COMUNIDAD	TIPO DE TRABAJO	SUPERFICIE (HECTAREAS)	INGRESO (Bs)
IRPA CHICO	CANAVIRI	RASTREADO	3	540
BATALLA DE INGAVI	CHONCHOCORO	RASTREADO	2	360
CONIRI	QUINAMAYA	RASTREADO	1	180
	VILLA PONGUINI	RASTREADO	2	360
	MOLLOJAHUA	RASTREADO	3	540
IRPA GRANDE	TACAGUA	RASTREADO	3	540
	CHUSÑUPA	RASTREADO	1	180
V. SANTIAGO DE CHACOMA	HILATA SAN JORGE	RASTREADO	4	720
<b>TOTAL</b>	<b>8 COMUNIDADES</b>		<b>19</b>	<b>3420</b>

**TOTAL GENERADO (RASTREADO Y ARADO ES DE Bs. 16.680).**

# SEGURO AGRARIO (AGROPECUARIO) D-3

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR  
DESASTRES NATURALES:  
INUNDACIÓN, GRANIZADA Y  
HELADA.

PRESUPUESTO

228.096

EJECUTADO

228.096

%

100

**15 COMUNIDADES  
ENDEMINIZADOS  
306 FAMILIAS BENEFICIADAS  
157.890 HECTAREAS DE  
CULTIVO INDEMINIZADOS**

**500 Bs PROMEDIO  
INDEMINIZADO/FAMILIA**



# PERFORACION DE POZOS DE AGUA SUBTERRANEO D-3

ADQUISICIÓN DE INSUMOS,  
MATERIALES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE  
Y CONTRATACIÓN DE 3 OPERADORES  
PARA PERFORACIÓN DE POZOS

**PRESUPUESTO**

**250.096**

**EJECUTADO**

**243.195**

**%**

**97**

## BENEFICIARIOS

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1. INGAVI        | 7. HICHURAYA       |
| 2. JALSURI       | 8. CHONCHOCORO     |
| 3. CALLISAYA     | 9. CHALLAJAHUIRA   |
| 4. CHARAHUAYTO   | 10. BLANCA FLOR    |
| 5. ACHICA ARRIBA | 11. MAZO CRUZ URB. |
| 6. ANCARA        | ARCANGEL I         |

**BENEFICIARIOS:  
9 COMUNIDADES  
Y 2 URB. DEL D-3**

**11 PERFORACIONES  
DE POZOS DE AGUA  
SUBTERRANEO.**



**46 POZOS PERFORADOS  
GESTIÓN 2015-2019**

# LIMPIEZAS DE POZOS DE AGUA SUBTERRANEO D-3

**PRESUPUESTO**

**0**

**MONETIZADO**

**225.000**

**LIMPIEZAS DE POZO DE AGUA  
SUBTERRANEO**

**BENEFICIARIOS:**

**42**

**COMUNIDADES  
Y 3 URB. DEL  
D-3**

**45**

**LIMPIEZAS  
DE POZOS DE  
AGUA**



**COSTO DE LIMPIEZA  
POR UN PRIVADO 5.000 Bs.**

# FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO FDI-1

**18 COMUNIDADES      352 FAMILIAS**  
 CONTRUCCION DE: ESTABLOS, CARPA SOLAR,  
 ESPACIO DE ORDEÑO Y TANQUE DE AGUA.

PRESUPUESTO	1ER DESEMBOLSO EJECUTADO	%
<b>7.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100</b>

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. PAN DE AZUCAR   | 10. PONGUINI       |
| 2. MAZO CRUZ       | 11. COLLAGUA       |
| 3. JALSURI         | 12. HEQUERI        |
| 4. MAMANI          | 13. CHUSÑUPA       |
| 5. CHALLAJAHUIRA   | 14. VILLA ANCARA   |
| 6. CONTORNO ARRIBA | 15. HICHURAYA ALTA |
| 7. CONTORNO        | 16. HILATA ARRIBA  |
| PALLCOSO           | 17. H. SANTA       |
| 8. LLAJMAPAMPA     | TRINIDAD           |
| 9. COPALACAYA      | 18. CHACOMA IRPA   |
|                    | GRANDE             |

**BENEFICIARIOS: 18 COMUNIDADES Y  
 352 FAMILIAS**



# CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA FDI-2

**17 COMUNIDADES      386 FAMILIAS**  
 CONTRUCCION DE: ESTABLOS,, ESPACIO DE ORDEÑO  
 Y TINAJA DE LECHE.

PRESUPUESTO	1ER DESEMBOLSO EJECUTADO	%
<b>6.233.867</b>	<b>2.493.547</b>	<b>40</b>

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. CHAÑOJAHUA      | 10. CHONCHOCORO     |
| 2. QUINAMAYA       | 11. SEQUECHURO      |
| 3. V.SANTA CHACOMA | 12. CONTORNO CENTRO |
| 4. ANCARA          | 13. CONTORNO BAJO   |
| 5. ACHICA ARRIBA   | 14. PALLINA GRANDE  |
| 6. CALLISAYA       | 15. SURIPANTA       |
| 7. VILLA ARRIENDO  | 16. CHOQUENAIRA     |
| 8. MOLLOJAHUA      | 17. H. SAN JORGE    |
| 9. CHUQUIÑUMA      |                     |

**BENEFICIARIOS: 17 COMUNIDADES Y  
 386 FAMILIAS**



GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



# GESTIÓN AMBIENTAL



# PROGRAMA (MEDIO AMBIENTE)

Apertura	Detalle del gasto	Presupuesto	Ejecutado	%
Apoyo a medio ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratación de 1 consultor para el control a las industrias</li> <li>Adquisición de afiches, banners y trípticos para capacitaciones</li> <li>Adquisición protectores y cobertores</li> <li>Adquisición de EPPs para las inspecciones</li> <li>Pago de luz y agua de las áreas y predios dependientes de la dirección</li> </ul>	115.000,00	102.622,00	89,24
Monitoreo ambiental	Contratación de Laboratorio para el Análisis de Agua en las Comunidades Chonchocoro e Ingavi	40.000,00	10.635,00	26,59
(PREVENCION CONTAMINACION DE LA CUENCA KATARI Y BAHIA DE COHANA)	Adquisición de EPPs, rastrillos, yutes u otros para la campaña de limpieza de ríos con el fin de prevenir la contaminación de la cuenca Katari y Bahía de Cohana	15.000,00	12.660,00	84,40



**CAMPAÑAS  
AMBIENTALES**



**INSPECCIONES**

# PROGRAMA (MEDIO AMBIENTE)

## FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS VERDES

Apertura	Detalle del gasto	Presupuesto	Ejecutado	%
MANTENIMIENTO DE ORNATO PUBLICO SECCIONAL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compra de herramientas, pinturas para las áreas verdes</li></ul>	<b>30.000,00</b>	<b>24.698,50</b>	<b>82,33</b>
APOYO A ORNATO PUBLICO SECCIONAL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contratación de 2 obreros para el ornato publico</li></ul>	<b>48.700,00</b>	<b>46.995,50</b>	<b>96,50</b>
APOYO AL VIVERO MUNICIPAL SECCIONAL	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Contratación de 1 viverista para el manejo del vivero</li><li>▪ Compra de semillas insumos semillas, y material de ferretería</li><li>▪ Pago de luz y agua del vivero</li></ul>	<b>70.000,00</b>	<b>63.724,50</b>	<b>91,04</b>



**PRODUCCIÓN DE PLANTINES**



**MANTENIMIENTO DE ORNATO PUBLICO**

# PROGRAMA (ASEO URBANO)

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
1.370.000	1.323.481	96,

- Contratación de 38 personas de Limpieza.
- Contratación de un chofer de Volqueta de Residuos Solidos.
- Adquisición de material de limpieza, indumentarias y herramientas.
- Gasto en combustible para la maquinaria (compactadoras, volquetas y retroexcavadora).
- El recojo diario de residuos solidos en la gestión 2019 fue de 60 toneladas, haciendo 17.280Tn/año

## GENERACIÓN POR DISTRITO


- D- 1 y 2 = 21 TONELADAS
- D- 6 = 4 TONELADAS
- D- 7 = 35 TONELADAS

**1.064.853,3 Bs**

**29.062,7 Bs**

**83.701,8 Bs**

**145.863,2 Bs**

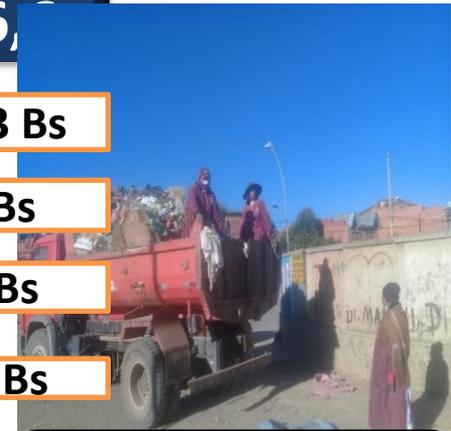

**RECOLECCIÓN PUNTOS DE ACOPIO**



**BARRIDOS DE FERIAS**

# PROGRAMA (ASEO URBANO)

**PRESUPUESTO**

**1.370.000**

**EJECUTADO**

**1.323.481**

**%**

**96,6**

## DETALLE POR DISTRITO DEL GASTO CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE ASE URBANO

Distrito	Cantidad de personal de aseo urbano	Actividad	Monto ejecutado Bs.
Distrito 1	14	Limpieza de calles, av., plazas y puntos de acopio.	392,314.4
Distrito 2	14		392,314.4
Distrito 6	8		224,179.6
seccional	2	Limpieza de afluentes y ríos	56,044.9
<b>TOTAL</b>			<b>1.064.853,3 Bs</b>

# PROGRAMA (Relleno Sanitario)

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
395.023	343.381	86,9

- Contratación de un supervisor para el relleno sanitario, un operador de maquinaria pesada, un fumigador y un Maestro albañil
- Adquisición de EPPs
- Adquisición de Insecticidas
- Adquisición de Geomembrana y tubos PVC para la captación del liquido lixiviado y biogás
- Adq. de bomba centrífuga de desagüe y manguera de lona flexible para el lixiviado.
- Gasto en combustible para la maquinaria (topadora, retroexcavadora y bombas).
- El relleno sanitario cuenta con su LICENCIA AMBIENTAL aprobado vigente
- Se realiza un tratamiento de 62 Tn/día de residuos solidos provenientes de aseo urbano u otros.

149.903, 33 Bs

11.431, 00 Bs

14.500, 00 Bs

156.860, 00 Bs

9.789, 12 Bs

897,67 Bs



**LICENCIA AMBIENTAL**



**MANEJO DE LA CELDA ACORDE AL MANIFIESTO AMBIENTAL APROBADO**

# PROGRAMA (APOYO AL CEMENTERIO GENERAL)

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
140.000	129.670	92

- Contratación de un albañil y un guardia de seguridad
- Adquisición de material de limpieza, ferretería, eléctricos y otros.
- Adquisición de indumentaria de trabajo.
- Adquisición de cemento, fierros y arena para la refacción de nichos
- Adquisición de pinturas para el mantenimiento del cementerio para la festividad de todos santos
- Gasto para el pago de luz y agua
- **RECAUDACIÓN DE LA GESTIÓN POR:**
  - ❖ 209 inhumaciones
  - ❖ 121 rehabilitaciones
  - ❖ 149 actividades varias
- TOTAL RECAUDADO**
  - 206.264,50 Bs

58.693,33 Bs

14.285, 00 Bs

9.323, 00 Bs

19.385, 00 Bs

14.247, 00 Bs



REFACCION DE NICHOS



REFACCION PARA TODOS SANTOS

GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



GOBERNABILIDAD



# INTENDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
APOYO A LA INTENDENCIA D-1, 2, 3 Y 6 (contratación de 2 policías municipales, compra de uniformes, pago de luz y combustible)	114.000,00	98.293,89	86,22
EQUIPAMIENTO INTENDENCIA MUNICIPAL, SECC. (Compra de 4 cámaras de video vigilancia para la feria de jueves y domingo)	96.000,00	48.042,00	50,04
APOYO A LA INTENDENCIA D-7 (Contratación de 3 policías municipales, compra de uniformes)	90.000,00	83.670,00	92,97



# TRAFICO VIALIDAD Y SEÑALIZACIONES

NOMBRE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
APOYO A TRÁFICO Y VIALIDAD D-1, 2 Y 6 (Contratación de 14 reguladores viales, compra de uniformes, señalizaciones, conos, cintas y combustible)	350.000,00	326.455,92	93,27
APOYO A VÍAS Y SEÑALIZACION (compra de 4 semáforos para la Av. Busch Esq. Murillo)	50.000,00	49.825,00	99,65
APOYO A TRÁFICO Y VIALIDAD D-7 (Contratación de 3 reguladores viales, compra de uniformes)	100.000,00	89.047,51	89,05



# SEGURIDAD CIUDADANA IDH

NOMBRE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
CONST. MODULO POLICIAL DISTRITO 3 (Irpuma Irpa Grande)	50.863,00	50.448,00	99,18
APOYO A SEGURIDAD CIUDADANA SECCIONAL (Compra de material de escritorio y limpieza, pago de servicios básicos, internet y combustible)	226.448,00	217.513,87	96,05
EQUIPAMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA (Compra de 18 alarmas vecinales)	149.318,00	109.998,00	73,67
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (compra de camioneta para la FELCC)	158.800,00	158.688,00	99,93
CONST. MODULO POLICIAL URB. MARISCAL SANTA CRUZ U.V. 4H D-7	50.000,00	48.643,00	97,29



# SEGURIDAD CIUDADANA R.P.

NOMBRE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
GUARDIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA D-1, 2, 3 Y 6 ( Contratación de 16 Guardias Municipales, compra de uniformes, combustible)	451.000,00	448.843,32	99,52
GUARDIA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA D-7 (Contratación de 9 Guardias municipales, compra de uniformes, combustible)	249.000,00	235.183,20	94,45



GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



DEPORTES



# DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

**CONSTRUCCIÓN SALAS  
DEPORTIVAS COLISEO  
CERRADO, SECCIONAL**

**PRESUPUESTO**

**299.601**

**EJECUTADO**

**299.599**

**%**

**100**

**OBRA FINA - COMPLEMENTACIÓN**



# DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

**CONSTRUCCIÓN ENMALLADO  
CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO  
U.E. ACHICA ARRIBA**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
<b>350.392</b>	<b>349.501</b>	<b>99,75</b>

**FASE ÚNICA DE EJECUCIÓN**



# DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

**MANTENIMIENTO DE  
ESCENARIOS DEPORTIVOS,  
DISTRITO 1 Y 2**

**MONTO  
CONTRATADO**

**46.008,93**


**EJECUTADO**

**46.008,93**

**%**

**100**

**GRADERÍAS CANCHA MUTUAL LA PAZ**

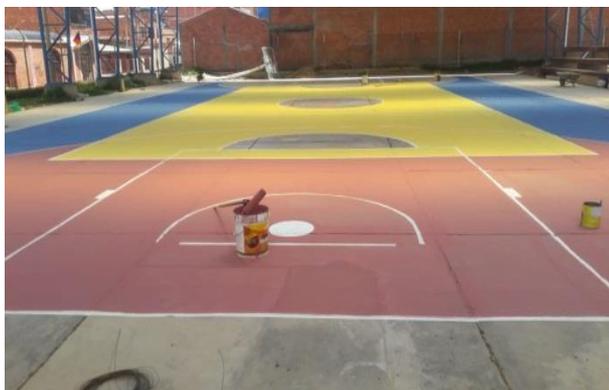

# DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

**MANTENIMIENTO DE  
ESCENARIOS DEPORTIVOS,  
DISTRITO 1 Y 2**

**MONTO  
CONTRATADO**

**39.962,31**

**EJECUTADO**

**39.962,31**

**%**

**100**

**ENMALLADO FRONTONES URB. C.B.N.**



# DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

**CONSTRUCCIÓN DE  
CANCHA POLIFUNCIONAL,  
ZONA SAN JOSE, DISTRITO 2**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
80.000	79.983	99,98


**ENMALLADO Y CONTRAPISO**



# DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE  
CÉSPED SINTÉTICO, Z/  
MARISCAL SANTA CRUZ,  
DISTRITO 2**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
250.000	248.242	99,30

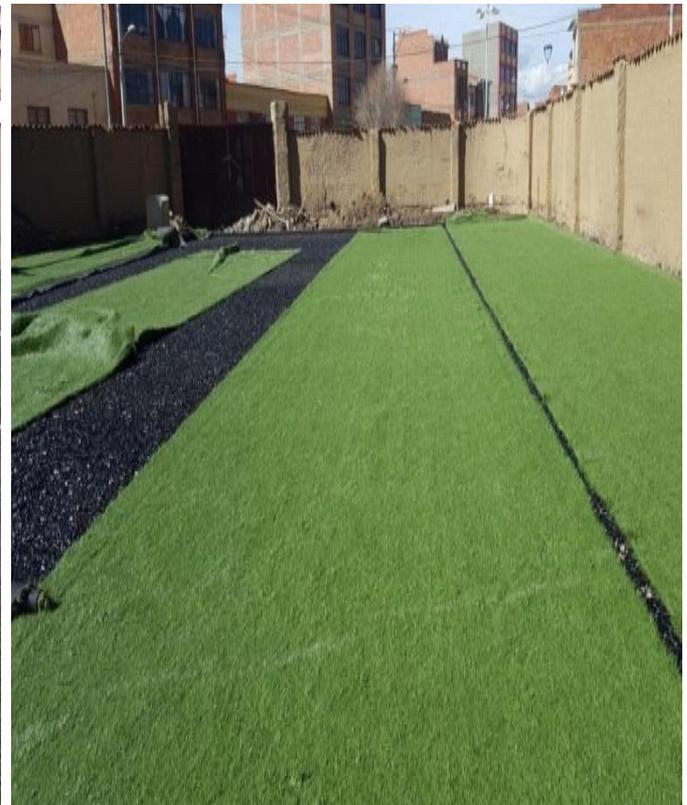

# DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

**CONSTRUCCIÓN COLISEO  
CERRADO, Z/VILLA SARA,  
DISTRITO 1**

**PRESUPUESTO**

**268.472**

**EJECUTADO**

**268.312**

**%**

**100**

**OBRA GRUESA - COLUMNAS**



# DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

**CONSTRUCCIÓN COLISEO  
CERRADO MULTIFUNCIONAL  
DISTRITO 7 VIACHA, SECCIONAL**

MONTO CONTRATADO	EJECUTADO	%
10.198.099,99	7.334.870,94	63

**GAMV  
CANCHA PISO  
AMORTIGUANTE**

**450.000**

**PROYECTO UPRE**



# PROGRAMA (DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE)

## APOYO AL DEPORTE, SECCIONAL

PRESUPUESTO

500.702,00

EJECUTADO

454.856,00

%

90,84

- CONTRATACIÓN DE 8 PORTEROS
- CONTRATACION DE DOS CONSULTORES DE LINEA
- ADQUISICION DE ARCOS DE FUTBOL PARA LAS PARA LAS URB. DE LOS DISTR. 1, 6 Y 7
- ADQUISICION DE BANERS PARA LA DIRECCION DE DEPORTES
- REPARACION DE LA CASAMATAS DE LA CANCHA DE CESPED SINTETICO DE FUTBOL Z. FABRIL
- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL DELINEADO DE CANCHAS

**SUELDO PERSONAL DE  
PORTERIA 2.435 Bs./MES**



# PROGRAMA (DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE)

## COMPETENCIAS DEPORTIVAS, SECCIONAL

PRESUPUESTO

200.000

EJECUTADO

182.085

%

91

- ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE PARA LA DIFERENTES SELECCIONES DEPORTIVAS

BENEFICIARIOS:

**787** DEPORTISTAS DE :

**AJEDREZ**

- ATLETISMO
- BASQUETBOL
- FISICOCULTURISMO
- FUTBOL SALA
- KUNG FU
- RAQUETA
- VOLEYBOL



# PROGRAMA (DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE)

## ESCUELAS DE FORMACIÓN DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS

- CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES PARA LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, BASQUETBOL, RAQUETA, KUNG FU, ATLETISMO, AJEDREZ, FISICOCULTURISMO, GIMNASIA ARTISTICA (INSTRUCTORES POR DISTRITO)

**BENEFICIARIOS:**  
**MAS DE 2.000 PERSONAS**  
**ENTRE NIÑOS Y JOVENES DE**  
**LOS DISTRITOS 1, 2, 6 Y 7**

PRESUPUESTO

830.080,00

EJECUTADO

769.656,00

%

92,72



# PROGRAMA (DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE)

## APOYO AL DEPORTE, DISTRITO 3

PRESUPUESTO  
214.000,00

EJECUTADO  
200.747,20

%  
94,72

- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO 3
- ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA SELECCIÓN DE LA JACHA MARKA VIACHA Y LA MARKA JACHA HILATA (CAMPEONATO SIMACO)
- ADQUISICIÓN DE MALONES Y REDES PARA EL CAMPEONATO INTER MARKAS VIACHA
- DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE A COMUNIDADES POLERAS Y CORTOS 60bs. DEPORTIVOS 135 Bs. SERVICIO DE TRANSPORTE: 4.736,00 BS. POA POR COMUNIDAD 3.343 BS.

### BENEFICIARIOS:

58 COMUNIDADES DEL DISTRITO 3



# PROGRAMA (DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE)

## JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES PRESIDENTE "EVO"

PRESUPUESTO

300.000,00

EJECUTADO

288.792,00

%

95,97

**625 Bs/por estudiante**

- ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA
- CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FASE CIRCUNSCRIPCION

### BENEFICIARIOS:

**480** PERSONAS ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LOS 5 DISTRITOS.



GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



**DIRECCIÓN DE  
GESTIÓN SOCIAL  
UNIDAD  
SERVICIO LEGAL  
INTEGRAL  
MUNICIPAL**



# PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL)

## EQUIDAD DE GENERO

A.P. 25.0000.01

PRESUPUESTO

50.000.00

EJECUTADO

42.750.00

%

86

\* Adquisición de material de Capacitación D 1, 2, 6 y 7 bolso plegable, taller “CREACIÓN DE LA RED VECINAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA”

\* Adquisición de material de Capacitación D 3, Porta documentos, Taller “TRABAJANDO POR UN MUNICIPIO LIBRE DE VIOLENCIA”, dirigido a los jilir y jalja mallkus (chacha warmi)

\* Adquisición de material de Capacitación y Servicio Refrigerio D 3 Taller “LIDERAZGO FORTALECIMIENTO DE LA MUJER INDÍGENA ORIGINARIO – VIACHA”



Actividade de Prevención	Total Actividades
Talleres, Ferias y otros	25

# PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL)

## SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIM

**PRESUPUESTO**

**76.529.00**

**EJECUTADO**

**69.054.00**

**%**

**90 %**

\* Contratación de un consultor de línea -  
**ABOGADO SLIM**

\* Adquisición de MATERIAL DE DIFUSIÓN:  
cuadernos, trípticos, afiche violentometro,  
Taller "CREACIÓN DE LAS RED VECINAL DE  
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA".

N°	TIPOLOGÍA	Casos Antiguos	Casos Nuevos 2019	TOTAL
1	Violencia Física	-	14	14
2	Violencia Feminicida	-	2	2
3	Violencia Psicológica	-	34	34
4	Violencia Mediática	-	1	1
5	Violencia Sexual	2	5	7
6	Violencia en la familia	3	94	97
7	Cualquier otra forma de violencia	-	76	76
<b>T O T A L</b>		<b>5</b>	<b>226</b>	<b>231</b>

N°	ÁREA	NUMERO DE ATENCIÓN
1	Jurídico	1.464
2	Trabajo social	670 *
3	Psicología	226 *
* Coordinación técnicos DNA		

**Total de atención a la población Distrito 1, 2 y 3  
4.850 USUARIOS**

# PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL)

## SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIM

PRESUPUESTO

76.529.00



EJECUTADO

69.054.00


%

90 %

### Estado actual de 226 casos nuevos aperturados gestión 2019



GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



**DEFENSORÍA DE LA  
NIÑEZ Y  
ADOLESCENCIA**



# PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL)

**DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DNA D 1, 2 y 3**

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
405.530,00	368.885,93	91%

## CONTRATACION DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

CONTRATACION DE ABOGADO, TRABAJADORA SOCIAL, PSICOLOGA Y CHOFER

SERVICIO	N° CASOS
LEGAL	1850
TRAB. SOCIAL	2208
PSICOLOGIA	756
<b>Total</b>	<b>3617</b>



# PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL)

## DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DNA D 1, 2 y 3

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
405.530,00	368.885,93	91%

**TALLERES DE PREVENCIÓN “SOCIALIZACION DE LA LEY 548 CODIGO NIÑA NIÑO Y ADOLESCENTE”**  
ADQUISICIÓN (CARTILLAS, TRIPTICOS, AFICHES, HOJAS,FOLDERS, AGENDAS, BOLIGRAFOS)

**DEFENSORIA MOVIL** ADQUISICION DE GLOBO INFLABLE TIPO CASA PARA CONSTITUIRNOS EN COMUNIDADES ALEJADAS

**“LA MARATON DE LA RUTA LIBRE DE VIOLENCIA”**  
ADQUISICION (MORRALES, TOMA TODOS, )

**“FERIA SOCIOEDUCATIVA SIN PEGAR NI HUMILLAR ES HORA DE CAMBIAR”** ALQUILER DE CARPAS, SILLAS y SERVICIO DE REFRIGERIO)



**GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA**



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN  
SOCIAL  
UNIDAD DE ADULTO  
MAYOR Y DISCAPACIDAD**



# PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

**CONSTRUCCIÓN CASA DEL  
ADULTO MAYOR Y PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD, SECCIONAL**

**PRESUPUESTO**

**250.000**

**EJECUTADO**

**249.846,62**

**%**

**99,94**

**OBRA GRUESA - BLOQUE II / MUROS Y CONTRAPISO**



# INFRAESTRUCTURA

**CONSTRUCCIÓN HOGAR PARA  
EL ADULTO MAYOR (AUQUI  
UTA), DISTRITO 6  
(ADQUISICIÓN DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCIÓN, FASE II)**

**PRESUPUESTO**

**40.000**

**EJECUTADO**

**39.633,60**

**%**

**99**

**CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS AMBIENTES PARA EL ADULTO MAYO**



Apoyo con mano de obra de la Sub Alcaldía y  
contraparte Adulto Mayor Urb. Machak Kantati  
DISTRITO 6



Concluido con los materiales de adquisición y  
contraparte Adulto Mayor Urb. Machak Kantati  
DISTRITO 6

# PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL)

## APOYO PERSONAS ADULTOS MAYORES

PRESUPUESTO

39.126


EJECUTADO

34.736

%

89

1. Contratación de un Personal – Técnico Asistente de Adulto Mayor
2. Taller de Socialización de derechos del Adulto Mayor, refrigerio
3. Contratación de Servicio de Transporte, traslado diferentes actividades

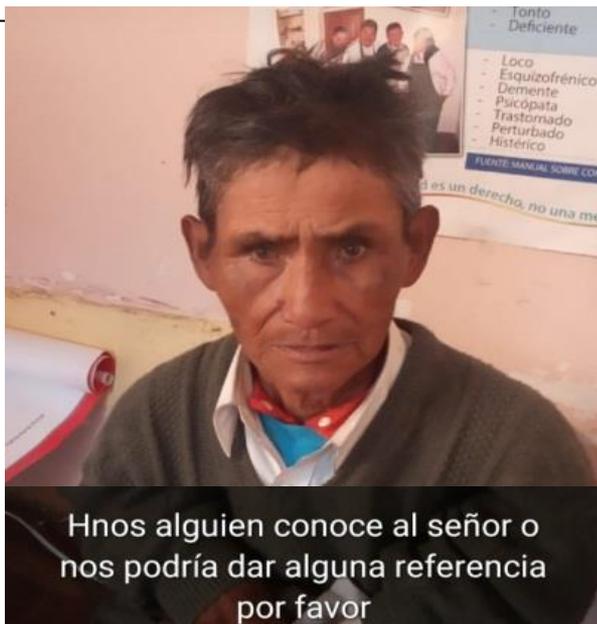

Hnos alguien conoce al señor o nos podría dar alguna referencia por favor

# PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL)

**AYUDA ECONOMICA PARA  
PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD - SECCIONAL**

**PRESUPUESTO**

**774.000**

**EJECUTADO**

**573.500**

**%**

**74 %**

- **15** cheque emitidos de enero a diciembre
- **251** PcD grave y muy grave (250 Bs/mes)
- El servicio promueve la adquisición de Carnet de discapacidad, con la calificación médica, social y psicológica.





# UNIDAD MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



Trabajo en Jóvenes

# PROGRAMA POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES

**Yo te Apoyare, Soy Joven Soy Líder  
(CHAMA HUAYNA) Seccional**

**PRESUPUESTO**

**20.000,00**

**EJECUTADO**

**16.100,00**

**%**

**80,50**

ACTIVIDAD	DETALLE
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA Y SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN	Afiche Juvenil Folder Institucional UMJ Cartilla Juvenil

ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES
ENCUENTRO DE JUVENTUDES Y GOBIERNOS ESTUDIANTILES	<b>170</b> Participantes
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y FORMACION DE LIDERAZGO	<b>2419</b> estudiantes
PROYECTO ARTISTICO LANZARTE VIACHA - EDUARDO ABAROA	<b>730</b> jóvenes/ participantes
PROGRAMA DE PASANTIAS Y VOLUNTARIADOS	<b>16</b> Universitarios



# PROYECTO DE EMPLEO JUVENIL “CH’AMA WAYNA – FUERZA JOVEN”

**Convenio: SOLIDAR SUIZA/AOS  
BRUCK LE PONT - GAMV**

**P. EJECUTADO  
300.000,00**

**%  
100**

ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES
ENCUENTROS DE LA RED DE JOVENES	250 Jóvenes
CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTOS Y HABILIDADES BLANDAS	134 Jóvenes
APOYO A EMPRENDIMIENTOS JUVENILES Y MADRES JOVENES CON CAPITAL SEMILLA (BS.- 4.000) C/U	13 jóvenes/madres emprendedores
APOYO A INICIATIVAS COMUNICACIONAL/CULTURAL (BS.- 3.000) C/U	10 grupos juveniles/activistas 300 jóvenes
TECNIFICACIÓN DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD	20 Mujeres Jóvenes



# PROYECTO ADOLESCENTES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO

**Convenio: SAVE THE CHILDREN - GAMV**

P. EJECUTADO  
**Bs.- 85.260,00**

%  
**100**

ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS/ PARTICIPANTES
PLAN DE DESARROLLO PERSONAL	<b>213</b> Adolescentes
TECNIFICACIÓN EN GASTRONOMÍA y REPOSTERÍA	<b>37</b> Adolescentes
INSERCIÓN LABORAL DE JOVENES TECNIFICADOS EN GASTRONOMÍA	<b>15</b> Adolescentes
CONCURSOS DE PROYECTOS SOCIALES	<b>18</b> Propuestas <b>140</b> Participantes
FONDOS E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Bs.- 3000 C/U	<b>11</b> PROYECTOS SOCIALES <b>700</b> jóvenes



GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



**DESARROLLO  
ECONOMICO  
PRODUCTIVO**



# PROGRAMA (UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO)

## APOYO FORTALICIMIENTO DE CODEL Y PRODUCTORES LOCALES SECCIONAL

PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
150.000,00	141,584,00	94,39

- TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN LECHERA, DERIVADOS LÁCTEOS Y CONSUMO LOCAL
- 2DA. FERIA VIACHA PRODUCE
- FERIA ECOLOGICA
- FERIA DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERI URBANA CON VALOR AGREGADO
- 3RA FERIA ANUAL PRODUCTIVA FEXPRO
- FERIA LA PAZ EXPONE EN EL CHUQUIAGO MARCA
- FEXPO VIACHA
- ASISTENCIA TECNICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ESTANDARIZACION DE PROCESO DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS PARA EL MUNICIPIO (CONSULTORIA POR PRODUCTO)
- - 6 FERIA Y 2 TALLERES SIN PRESUPUESTOS



FERIAS	15
ASISTENCIA TECNICA	1
TALLERES	3

# PROGRAMA (UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO)

**FEXPO VIACHA DISTRITO 1 Y2**

**PRESUPUESTO**

**20.000,00**

**EJECUTADO**

**18.142,00**

**%**

**90,71**

## FEXPO VIACHA

**CON LAS 20 ASOCIACIONES Y 2 FEDERACIONES  
LACTEOS – ARTESANIA – ALIMENTOS**



# PROGRAMA (PARQUE JAYUPUCHO)

## APOYO AL PARQUE JAYUPUCHU DISTRITO 1 Y 2

PRESUPUESTO

50.000,00

EJECUTADO

46.358,00

%

93,72

- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SERVICIO UN PORTERO
- SERVICIOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE JAYUPUCHO
- ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y OTROS
- LIMPIEZA DEL LAGO DEL PARQUE DESPUÉS DEL CORTE DE TOTORA



**VISITANTES AL PARQUE 2019**

**70,984 PERSONAS**

**INGRESO : 95.519 Bs.**

# PROGRAMA (MATEDRO MUNICIPAL SECCIONAL)

## APOYO AL SERVICIO DE MATEDERO MUNICIPAL SECCIONAL

**PRESUPUESTO**

**150.000,00**

**EJECUTADO**

**141,584,00**

**%**

**94,39**



➤ CONTRATACION DE PERSONAL (TOTAL 5) 1 PORTERO 4 LABADORES DE VICERAS

➤ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, INDUMENTARIA, MATERIAL DE ASEO, LIMPIEZA Y OTROS

**PRESUPUESTO**

**20.000,00**

**EJECUTADO**

**19,930,00**

**%**

**99,3**

## EQUIPAMIENTO MATADERO MUNICIPAL SECCIONAL

➤ ADQUISICIÓN HOJAS DE SIERRA Y ESCALERA, BALANCIN PARA EL NOQUEADOR

• CABEZAS DE GANADO: 6.678

• INGRESO: 248.085 Bs.



GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



# DESARROLLO URBANO



# TRAMITES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS GESTION 2019

TOTAL DE TRAMITES ATENDIDOS  
GESTION 2019

7.444 Tramites

TIPO DE TRAMITE	PLANOS EMITIDOS
PLANO DE LOTE	3779
LINEA NIVEL	113
PLANO DE CONSTRUCCION	29
NOTIFICACIONES OCUPACION DE VIA	45
HOJAS DE RUTA	2586
OCUPACIONES DE VIA	45
CERTIFICACIONES	686
DIVISIÓN PARTICIÓN	97
LEGALIZACIONES	57
NORMAS DE URBANIZACIONES	7




# TOTAL DE TRAMITES EN EL AREA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA

**TOTAL DE TRAMITES ATENDIDOS  
AREA DE TOPOGRAFIA -  
GEODESIA**

**199 Tramites**

1	PERFILES RAZANTES/CORDONES DE ACERA/LÍNEA NIVEL.	2	EJECUTADO
2	INSPECCIÓN TOPOGRÁFICO P/GEOREFERENCIADOS	171	EJECUTADO
3	LEV. TOPOGRÁFICOS P/REGISTRO DERECHO PROPIETARIO G.A.M.V.	24	EJECUTADO
4	OTRAS SOLICITUDES	2	EJECUTADO
TOTAL		199	EJECUTADO

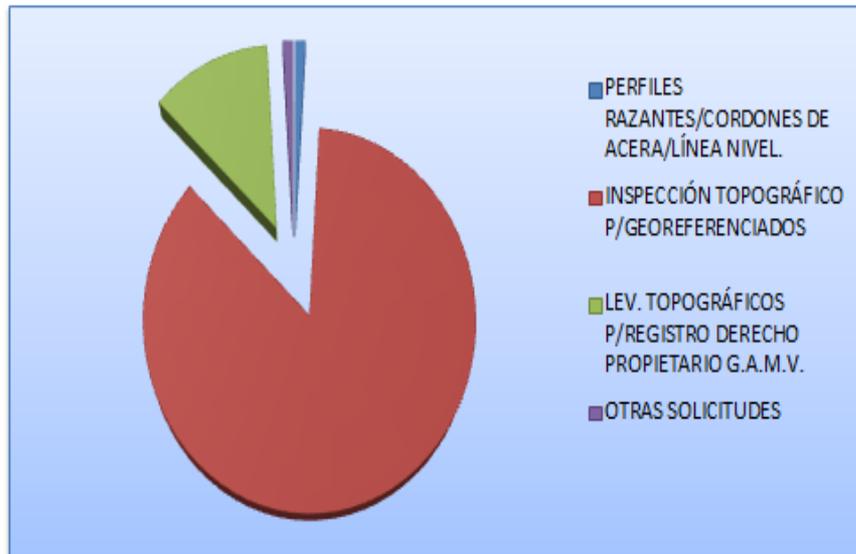

# URBANIZACIONES APROBADAS Y HABILITACIONES - GESTION 2019

**APROBADAS URBANIZACIONES**

17

**HABILITACIONES DE UNIDADES VECINALES - DISTRITO 7**

19

URBANIZACION		EN PROCESO	APROBADO	TOTAL	NORMAS
URB.	D-1 D-2	7	1	8	L.M. 013/17
URB.	D-3	15	12	27	L.M. 19/2017
URB.	D-6	3	4	7	O.M. 030/13 L.M. 019/17
URB.	D-7	3	-	3	O.M. 030/13 L.M. 019/17
HOMOLOGACIONES	D-7	3	-	3	L.M. 026/17 Y L.M. 009/18
HABILITACIONES	D-7		18	18	MARISCAL SANTA CRUZ
AVENIDA SUR ESTE HABILITADO	D-7		1	1	L.M. 019/17
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>TOTAL ATENDIDOS 67 URBANIZACIONES</b>	



# URBANIZACIONES APROBADAS - GESTION 2019

**TOTAL DE  
URBANIZACIONES  
APROBADAS**

**APROBADAS  
URBANIZACIONES**

**17**

**LOTES BENEFICIADOS**

**2.580**

URBANIZACIONES	DISTRITO	LOTES BENEFICIADOS
URB. SIMON BOLIVAR	D-1	157
URB. 5 DE MARZO	D-3	114
URB. BRISAS	D-3	84
URB. BERACA	D-3	73
URB. ROSALES	D-3	86
URB. AROMA	D-3	60
URB. LA JOYA	D-3	318
URB. VILLA ZUCABAR	D-3	98
URB. KATMANDU	D-3	61
URB. THREE BROTHERS	D-3	219
URB. VIRGEN DE LAS NIEVES	D-3	65
URB. PROGRESO	D-3	37
URB. LIBELA	D-3	284
URB. SAN VICTOR	D-6	186
URB. SANTA RITA	D-6	103
URB. SAN PEDRO	D-6	48
URB. COMPLEMENTACION SAN PEDRO	D-6	150
AV. SUR ESTE HABILITADO	D-7	437

**GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA**



**ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y  
CATASTRAL**



# PROYECTOS DE CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA

PROYECTOS EN PROCESO CONFORME A DECRETO SUPREMO 2960



**Mazo Cruz Admitido  
con R.M. 029/2019**




**Achica Arriba**



**Pocohota**



**Villa Santa Chacoma**

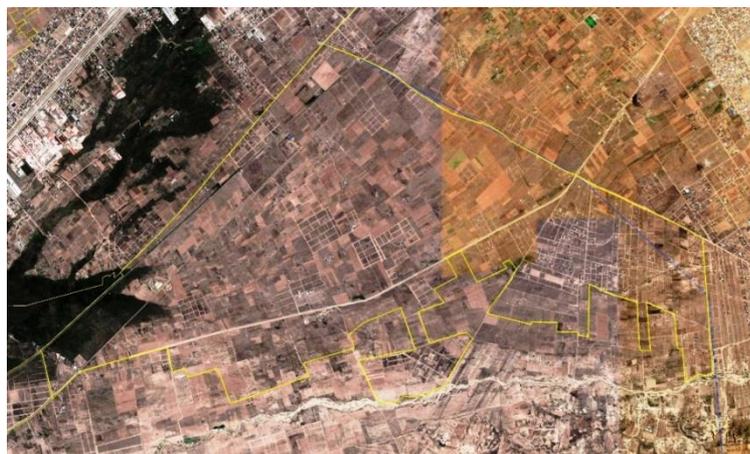

**Ingavi - Chicachata**



**Villa Remedios - Ancara**

# IMPLEMENTACION DE CATASTRO URBANO

<b>PREDIOS CATASTRADOS AREA URBANA POR EL MINISTERIO M.O.P.S.V.</b>	<b>42235</b>	<b>TOTAL</b>
<b>PREDIOS LEVANTADOS POR EL G.A.M.V.</b>	<b>3875</b>	<b>46110</b>



**Son 3875 predios catastrados como complemento por la empresa Landsig.**

**Son 65905 construcciones catastradas en el área urbana por la empresa Geodatum.**



# IMPLEMENTACION DE CATASTRO URBANO





PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA  
AL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA

ENTREGA OFICIAL DE LOS PRODUCTOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL  
AREA 2 Y AREA 3

EL SEICU Y CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS

EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CATASTRO

ESTUDIO INMOBILIARIOS DE MERCADO

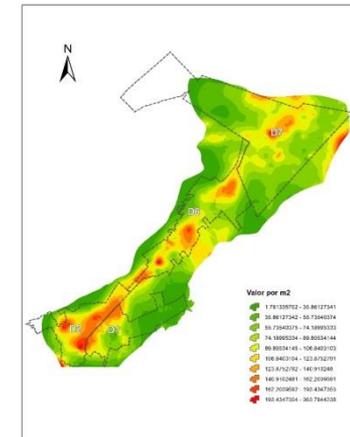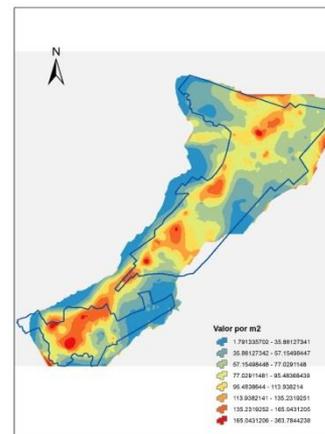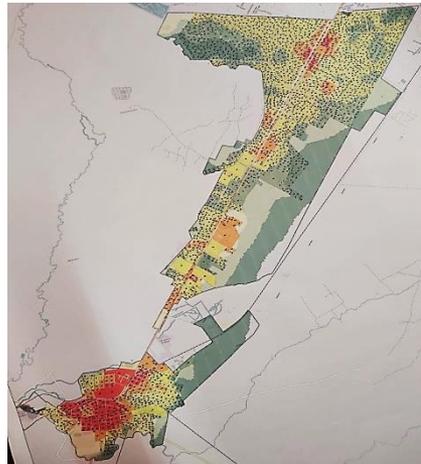

Sistema Espacial de Información Catastral Urbana

Estudio del Observatorio de Mercado Inmobiliario  
de terrenos y construcciones, empresa Gerenssa



GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA

**DIRECCIÓN  
JURIDICA**



## ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

CITES INTERNOS Y EXTERNOS	81 Notas
INFORMES LEGALES	116 (Tramites de usuarios y Concejo Municipal)
PROYECTOS DE LEYES MUNICIPALES	5 (De acuerdo a solicitud de la Unidades del GAMV)
DECRETOS MUNICIPALES	14 (Aprobados por el Ejecutivo Municipal)
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES	36
RESOLUCION TECNICA ADMINISTRATIVA – R.T.A. sobre aprobación de Planimetrías, división y Partición	149 Aprob. De Planimetrías, División y Partición
INFORMES APROB. GEOREFERENCIADOS	206 Tramites
CERTIFICACIONES DE PLANO DE LOTE	3.974 Tramites

## PROCESOS DE CONTRATACION

Nº	ELABORACIÓN DE CONTRATOS (diferentes modalidades conf. D.S. 0181)	Nº DE CONTRATOS
1	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE LINEA	98
2	CONSULTORIA POR PRODUCTO	16
3	SERVICIOS GENERALES	284
4	ADQUISICIONES	12
5	OBRAS ANPE	28
6	DIRECTA	52
7	EXCEPCION	07
8	LICITACION	10
9	EVENTUAL	11
10	CONTRATOS MENORES CONSULTORIAS	157
11	CONTRATOS MENORES SERVICIOS GENERALES	158
	<b>TOTAL</b>	<b>994</b>

<b>INFORMES LEGALES</b>	<b>103</b>
<b>Resoluciones administrativas</b>	<b>118</b>
<b>CONTRATOS MODIFICATORIOS</b>	<b>77</b>
<b>ORDEN DE CAMBIO</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>283</b>

## BIENES PATRIMONIALES

Nº	DETALLE DE BIENES REGISTRADOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	ESTADO
76	Saneamiento de Bienes (SESION DE AREA PUBLICA) , y Regularización de Derecho propietario	CONCLUIDOS
12	En tramite en Notaria de Gobierno para PROTOCOLIZACION	
7	En Tramite en Derechos Reales para FOLIO REAL	

PRESUPUESTO DIR. JURIDICA	PRESUPUESTO c/ Unidad	EJECUTADO	ACTIVIDADES DE GASTO
Bienes Patrimoniales	Bs. 51.000.-	Bs. 41,297,33.-	Pago de Aranceles para Regularización de Derecho Propietario
Gastos Judiciales	Bs. 49,000.-	Bs. 14,209,00.-	Pago de Testimonios judiciales, notificaciones, oficios, otros.


## ASUNTOS JURIDICOS

Según el avance se dará continuidad hasta su conclusión lo siguiente:

<b>Nº. PROCESOS JUDICIALES EN MOVIMIENTO</b>	<b>71</b>
Procesos Coactivos	27
Procesos Penales	39
Procesos Civiles	3
Procesos Laborales	2

PROCESOS CONCLUIDOS	
Caso 420/17 (Caso Camioneta del Concejo)	Sentencia condenatoria, en Apelación por el Sentenciado
Caso 216/18 (Ex Abogado SLIM DNA)	Sentencia condenatoria, en Apelación por el Sentenciado
Caso 492/18 (Centro de Salud Tilata Dist. 7)	Sentencia condenatoria, en Apelación por el Sentenciado

GOBIERNO AUTONOMO  
MUNICIPAL DE VIACHA



# DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL




INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2019


# ESTIMADO, PERCIBIDO Y DEFICIT DE RECAUDACION POR INGRESOS PROPIOS GESTION 2019 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)



## INGRESOS PROPIOS GESTION 2019

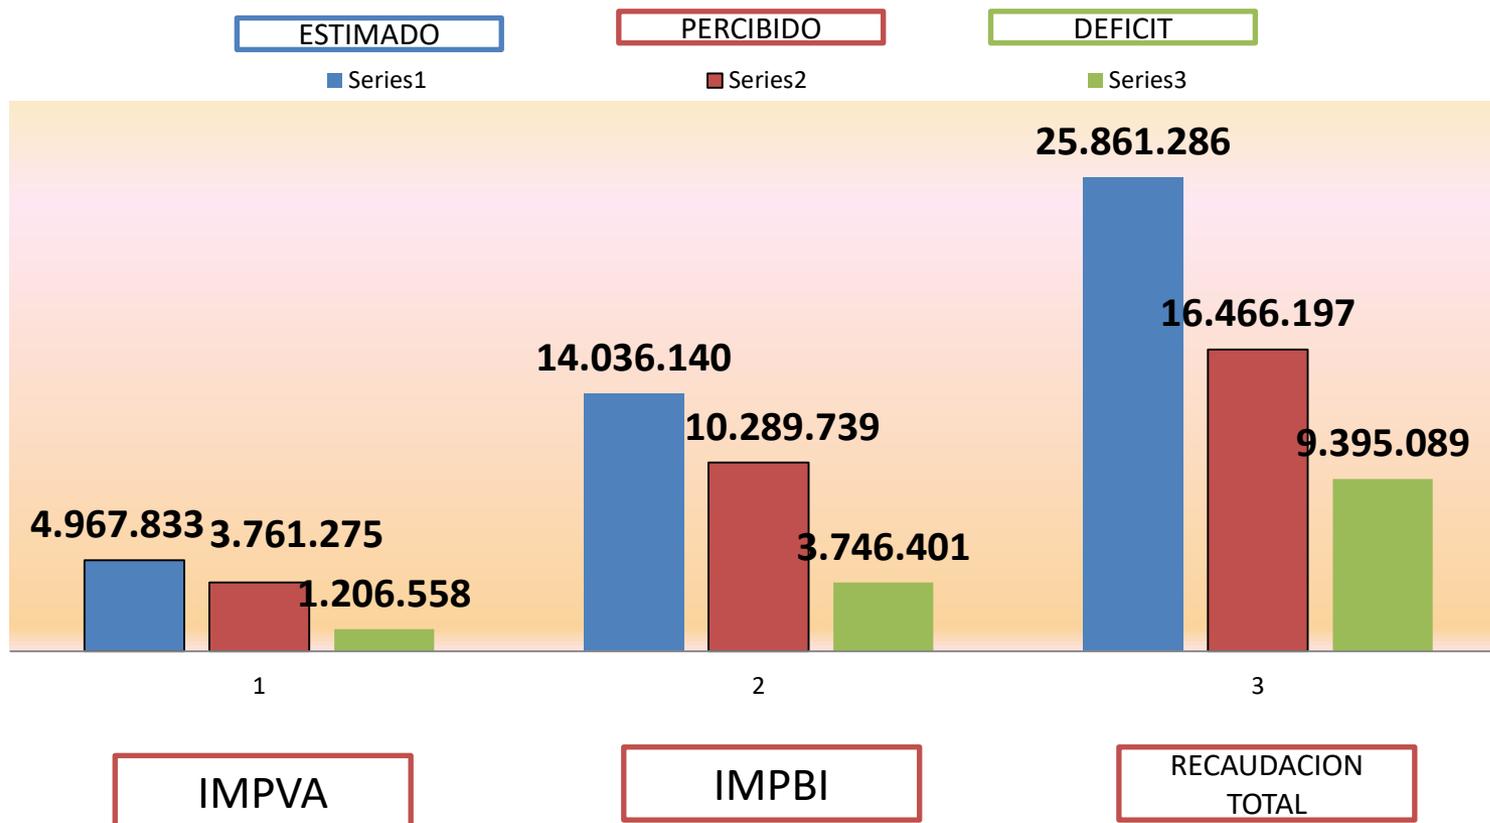

# COMPARACION DE MUNICIPIOS VIACHA – SACABA - QUILLACOLLO

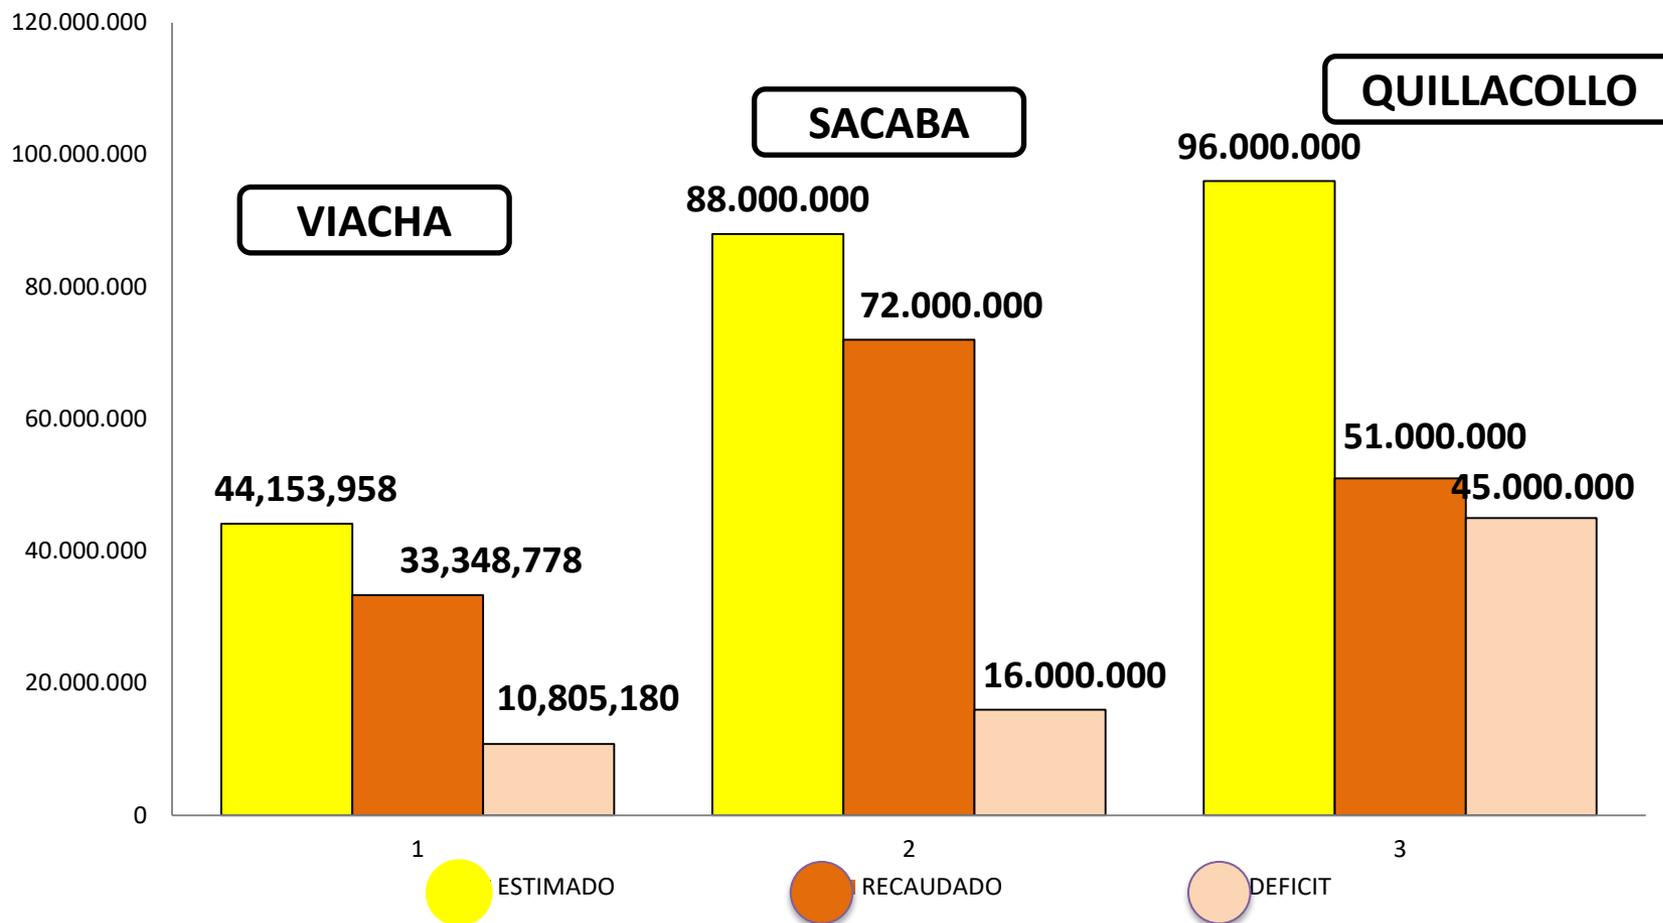

Fuente: Datos de Los Tiempos

# TRAMITES REALIZADOS EN LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL



## UNIDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES

**TOTAL TRAMITES : 1845**



**TOTAL VEHICULOS 2018**

**TOTAL VEHICULOS 2019**

**INCREMENTO**

**9.732**

**10.015**

**283**

## UNIDAD DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

**TOTAL TRAMITES: 929**

**RENOVACION – NUEVAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO**




# APROBACION DE LA LEY MUNICIPAL N° 018/2019




## LEY MUNICIPAL DE ACTUALIZACION DE TABLA DE VALORES SEGÚN LA CALIDAD DE VIA DE SUELO

- SE PRESENTO AL CONCEJO EN LA GESTION 2018
- FUE APROBADO EN LA GESTION 2019
- ENTRA EN VIGENCIA EN LA GESTION 2020
- INCREMENTO LEVE EN EL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES



## LOGROS:

# SE REALIZO POR PRIMERA VEZ EL PROCESO DE FISCALIZACION POR DETERMINACION MIXTA CON NOTIFICACION MASIVA (IMPBI – IMPVA)



TIPO DE IMPUESTO	NUMERO DE REGISTROS NOTIFICADOS	SUMA DE LA DEUDA	Nº REGISTROS TRAMITADOS PARA BAJA O CANCELAR	SUMA DE LA DEUDA CANCELADO
I.M.P. BIENES INMUEBLES	17.077	52.183.771,16 BS.	1669	133.043,00 BS
I.M.P. VEHICULOS AUTOMOTORES	4.259	11.358.807,00 BS.	927	379.451,00 BS

# RECTIFICACION POR ACTUALIZACION DE CONSTRUCCION Y DATOS TECNICOS A PERSONAS NATURALES EN EL IMPBI



DISTRITO MUNICIPAL	CANTIDAD DE INMUEBLES	MONTO SIN ACTUALIZACION	MONTO COBRADO CON RECTIFICADOS
D-1	283	19.725,00	216.511,00
D-2	269	12.585,00	89.705,00
D-3	59	2.372,00	19,593,00
D-6	224	8.421,00	92.594,00
D-7	1051	32.659,00	416.268,00
<b>TOTAL DISTRITOS</b>	<b>1886</b>	<b>75.762,00</b>	<b>834.671,00</b>




# PRESUPUESTO GESTIÓN 2019



# RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2019

RECURSOS CORRIENTES		
FUENTE/ORGANISMO	DETALLE	PRESUPUESTO 2019
41/113	COPARTICIPACION TRIBUTARIA	66,968,646
41/119	IDH	15,599,485
20/210	RECURSOS PROPIOS	44,153,958
20/230	RED DE SALUD	10,264,000
<b>SUB TOTAL</b>		<b>136,986,089</b>
TRANSFERENCIAS		
FUENTE/ORGANISMO	DETALLE	PRESUPUESTO 2019
43/314	FPS	1,727,261
92/230	FNDR	7,423,480
41/111	UPRE	15,621,983
80/345	UNFPA	478,579
41/119	FDI	5,600,000
42/230	OTROS RECURSOS ESPECIFICOS	539,227
<b>SUB TOTAL</b>		<b>31,390,530</b>
SALDOS CAJA BANCOS		<b>25,823,185</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2019</b>		<b>194,199,804</b>


# EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GAMV DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

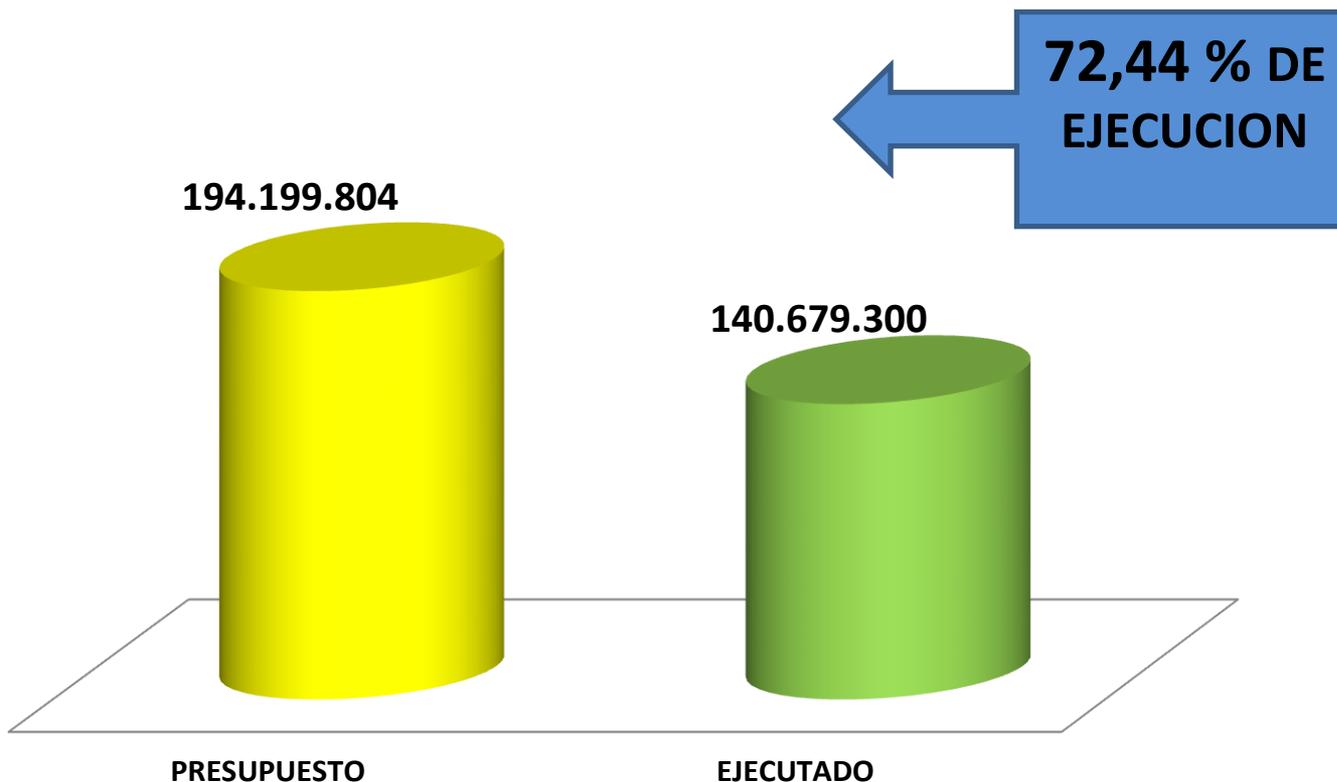

# COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

## PERCIBIDO


(Expresado en Millones de Bolivianos)

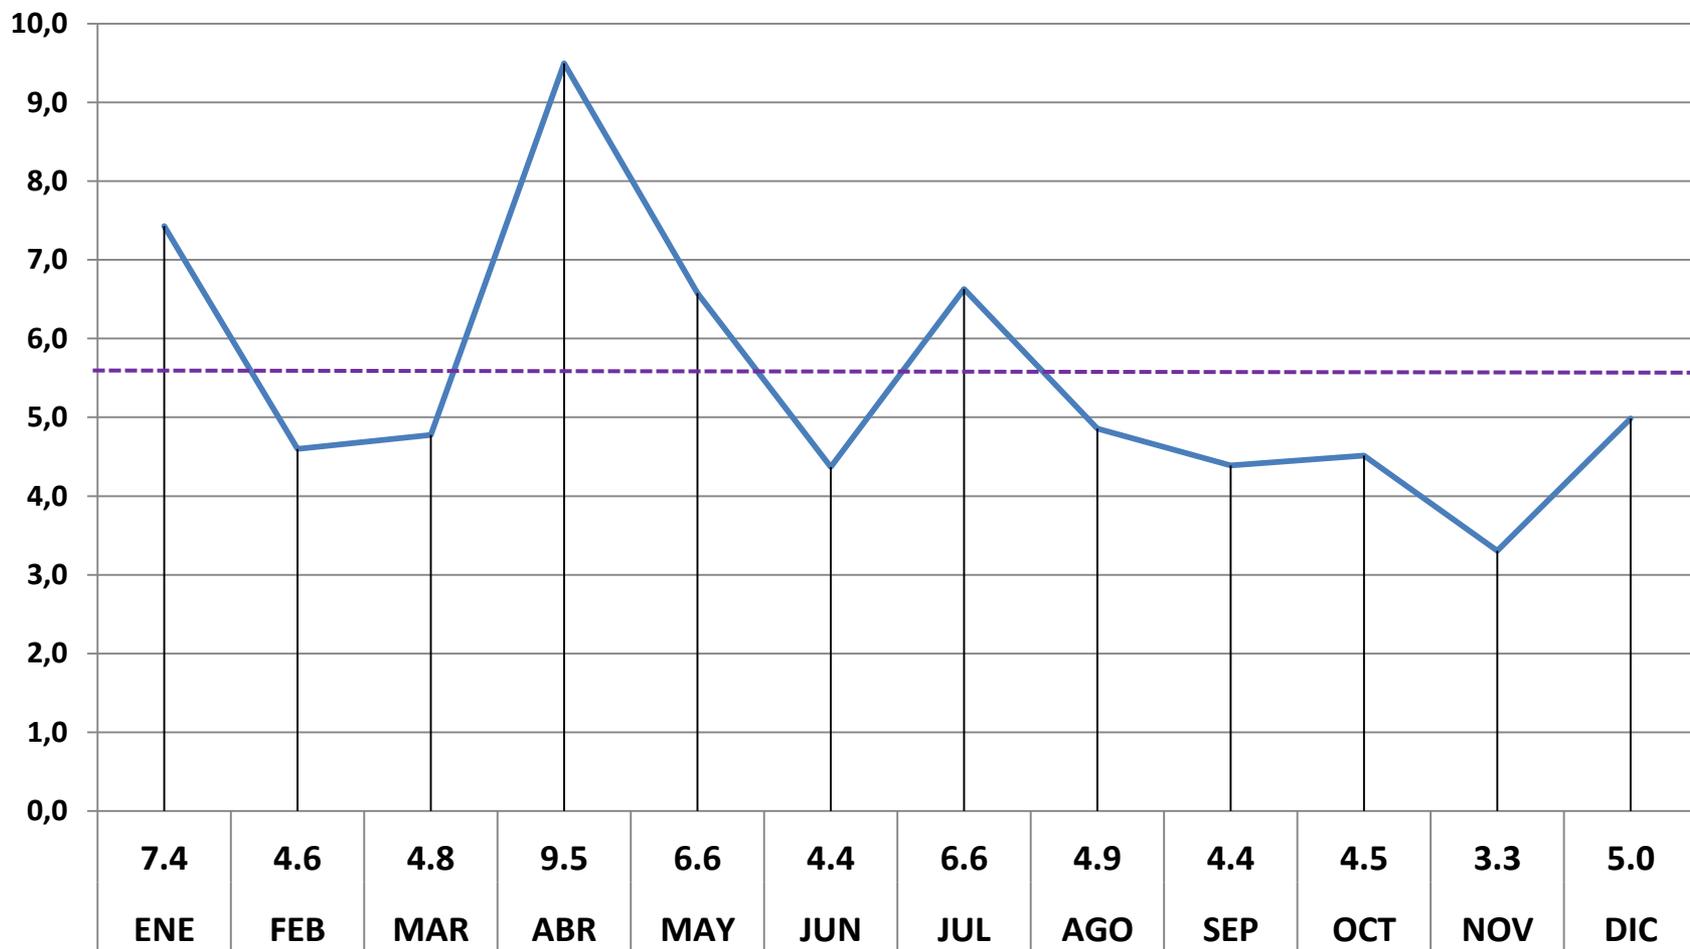

# IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

## PERCIBIDO


(Expresado en Millones de Bolivianos)



# RECURSOS PROPIOS

## PERCIBIDO

(Expresado en Millones de Bolivianos)

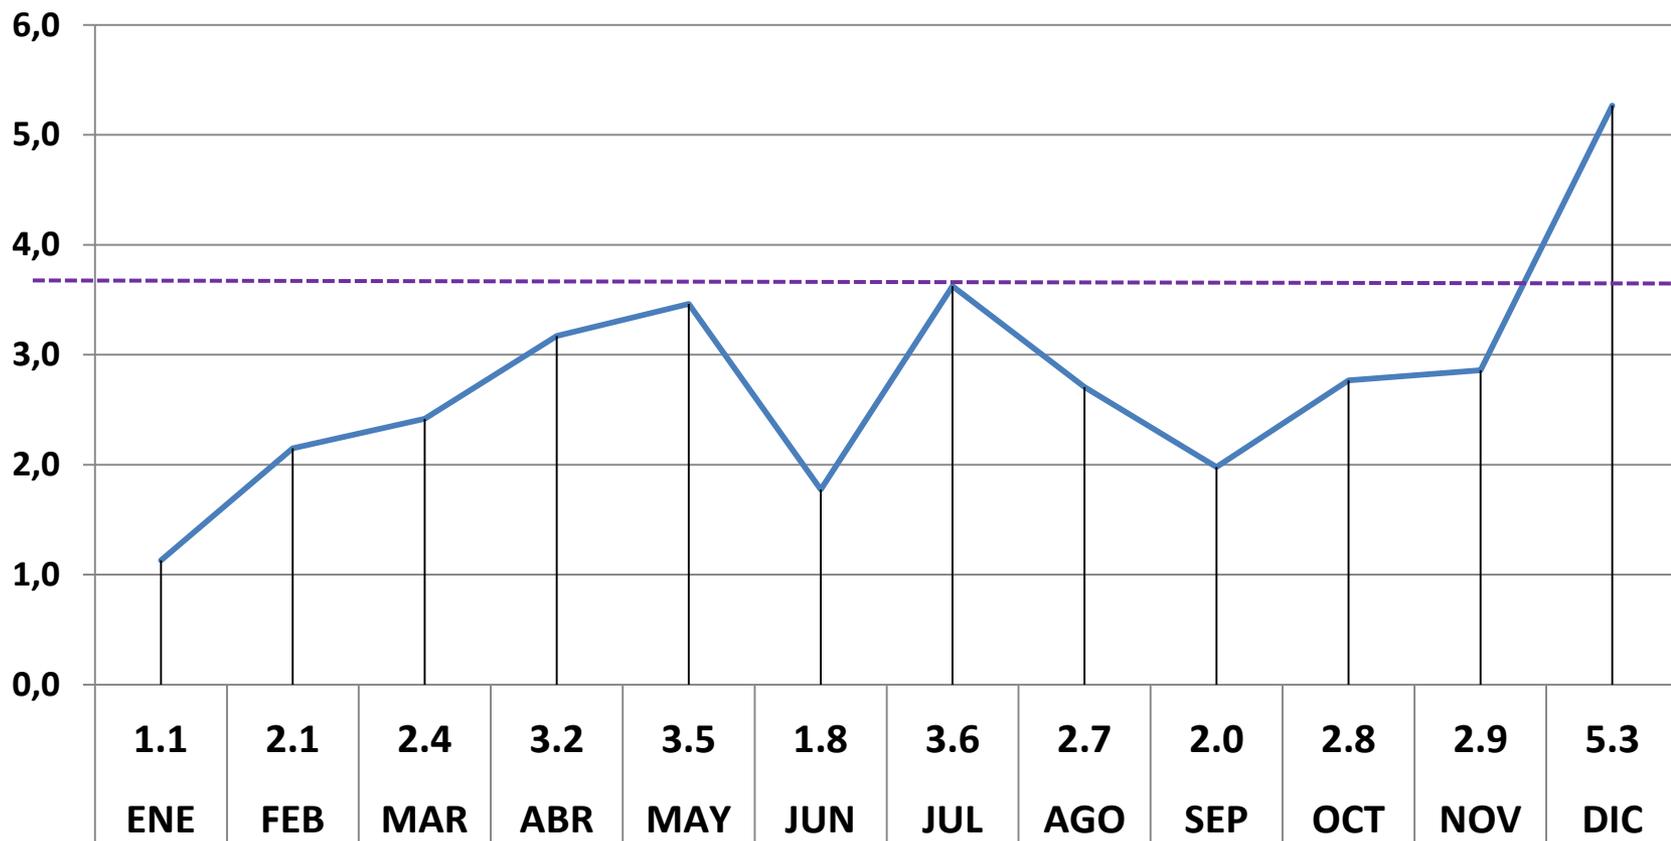

## RECURSOS PERCIBIDOS GESTION 2019

GESTION	DETALLE	PRESUPUESTADO	INGRESO BRUTO	DEFICIT / SUPERAVIT
2019	COPARTICIPACION TRIBUTARIA	66,968,646	65,925,451	-1,043,195
	IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS	15,599,485	12,968,901	-2,630,584
	RECURSOS PROPIOS	44,153,958	33,348,778	-10,805,180
TOTAL		126,722,089	112,243,130	-14,478,959

**NOTA:**

**DEFICIT DE Bs.**

**-14,478,959**



**EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL HA  
ADMINISTRADO 399 ACCIONES MUNICIPALES  
ENTRE PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSCRITOS  
EN EL POA DE LA GESTIÓN 2019**

**GRACIAS**
